

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE
INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA (2014 - 2024.)
ZA 2017. GODINU**

Prijedor, Jun 2018. godine

IZVRŠNI SAŽETAK

Izveštaj o implementaciji Strategije integralnog razvoja Grada Prijedora (2014-2024) ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog i društvenog razvoja, te zaštite životne sredine, u okviru četiri (4) definisana strateška cilja.

Planom implementacije za 2017. godinu planirana je realizacija 103 projekta ukupne vrijednosti **17.046.000,00 KM**. U 2017. godini započeta je ili je bila u toku implementacija 62 projekta, od kojih je 8 projekata u potpunosti završeno. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je **9.199.546,00 KM**, što je **54%** realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. Od ovog iznosa, 36 % sredstava je realizovano iz budžeta Grada, a 64 % iz eksternih izvora.

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za prethodnu 2017. godinu, Grad je realizovao ili je radio na realizaciji nekoliko projekata kojima se rješavaju ključni problemi zajednice ili ostvaruju preduslovi za realizaciju drugih ključnih vezanih projekata (projekti unapređivanja poslovnog okruženja koji imaju za cilj privlačenje domaćih i stranih investicija, projekti podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju, projekti podrške u poljoprivrednoj proizvodnji, projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata društvene infrastrukture, projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnja novih objekata komunalne, saobraćajne i tehničke infrastrukture, te projekti unapređenja sistema zaštite životne sredine).

Tokom 2017. godine sektorski ciljevi su realizovani u skladu sa planiranom dinamikom.

Najvažniji rezultati u realizaciji sektorskih ciljeva su:

- U ekonomskom sektoru u 2017. godini realizovano je (ili se kontinuirano realizuju) **34** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **1.876.513,00 KM**. Realizacijom navedenih projekata ostvareni su rezultati koji su planirani za 2017. godinu. Evidentirano je povećanje broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i realizovanih podsticaja, odnosno, broja korisnika podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji. U ovoj godini nastavljena je tendencija unapređenja konkurentnosti MSP, podrške preduzetništvu i zapošljavanju.

- U društvenom sektoru nastavilo se sa rekonstrukcijom objekata iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite. Takođe se radilo na realizaciji projekata koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže i drugi projekti. U društvenom sektoru u 2017. godini realizovano je (ili se kontinuirano realizuju) **19** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **6.298.607,00 KM**.

- U sektoru zaštite životne sredine u 2017. godini realizovano je (ili se kontinuirano realizuju) **9** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **1.024.426,00 KM**. U ovoj oblasti realizovani su projekti koji se odnose na izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka, izradu novog programa sanitarne zaštite izvorišta pitke vode na području grada Prijedora i drugi projekti.

Na osnovu prikazane realizacije projekata i ostvarenja sektorskih ciljeva, vidljiva je međusobna integrisanost i povezanost projekata i multisektorski doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva. U narednom periodu se nastavlja realizacija projekata koji se tiču vodosnabdjevanja, putne infrastrukture, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenja investitora, zapošljavanja, projekti podsticaja privrede i poljoprivrede i projekti promocije energetske efikasnosti, koji su međusobno povezani i u sinergiji. Kroz međusektorske uticaje, treba da daju značajan doprinos ostvarenju strateških ciljeva, a time i vizije grada Prijedora.

Iako je novi način planiranja implementacije, po MiPRO metodologiji, bio novina, svi učesnici planiranja i implementacije su u prethodnom periodu uspjeli savladati proces i uvesti novi pristup u planiranju, praćenju i vrednovanju implementacije strategije, što je samo po sebi značajan rezultat.

Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu realizacije Strategije u 2017. godini, preporuke za implementaciju Strategije razvoja grada Prijedora u 2018. godini su:

- treba da se nastavi sa realizacijom već započelih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.

- neophodno je planirati početak realizacije projekata koji su trebali biti započeti u 2017. godini, a nisu, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijedena sva potrebna sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

1. UVOD

Strategiju integralnog razvoja grada Prijedora za period 2014-2024. godine izradio je Razvojni tim grada Prijedora u periodu od oktobra 2012. do decembra 2013. godine, u okviru Projekta integralnog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Strategija razvoja grada Prijedora usvojena je u decembru 2013. godine na 2. vanrednoj sjednici Skupštine grada Prijedor, održanoj dana 26.12.2013. godine. Kao operativni instrument za realizaciju strategije, Grad priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije. Detaljan plan implementacije za period 2017.- 2019. godine je pripremljen i objavljen na web stranici Grada Prijedor.

Ovaj izvještaj se odnosi na implementaciju strateških, odnosno, sektorskih, prioriternih projekata u 2017. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije.

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica Grada.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom čitavog perioda koji pokriva ovaj izvještaj i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata-APIS). Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.

2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

2.1. Vizija

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014. – 2024. godine, definisana je sljedeća vizija:

„Prijedor 2024. – grad pravih investicija i uspješnih ljudi“.

2.2. Strateški ciljevi

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014 – 2024. godine, definisana su 4 strateška cilja:

Strateški cilj 1: Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja;

Strateški cilj 2: Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura;

Strateški cilj 3: Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana;

Strateški cilj 4: Uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti.

2.3. Sektorski ciljevi

Strateški prioriteti za razvoj grada su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi:

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1: Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone do 2019. godine;

Sektorski cilj 2: Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima;

Sektorski cilj 3: Pобољшanje turističke ponude grada Prijedora, prvenstveno na području Nacionalnog parka „Kozara“;

Sektorski cilj 4: Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja;

Sektorski cilj 5: Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva.

Društveni razvoj

Sektorski cilj 1: Izgrađena društvena infrastruktura – 2018 godine;

Sektorski cilj 2: Unaprijeđene društvene usluge građanima;

Sektorski cilj 3: Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura.

Sektor zaštite životne sredine

Sektorski cilj 1: Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta;

Sektorski cilj 2: Uspostavljen integralan sistema upravljanja otpadom;

Sektorski cilj 3: Smanjenje emisije CO₂ kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije;

Sektorski cilj 4: Izgradnja sistema upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacija stanovništva.

2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2017. godina)

Ključni prioriteti ekonomskog sektora

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2017. godinu su:

- stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za investiranje,
- podrška poljoprivrednoj proizvodnji,
- podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu,
- podrška zapošljavanju.

Fokusiranje na stalno unapređivanje poslovnog okruženja ima za cilj privlačenje investicija, što stvara preduslove za realizaciju sektorskog cilja 1 – „Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone do 2019. godine“ u narednim godinama.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji“.

Podrškom malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju stvaraju se uslovi za realizaciju sektorskog cilja 4 – „Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja“.

Ključni prioriteti društvenog sektora

U društvenom sektoru ključni prioriteti za 2017. godinu su:

- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata društvene infrastrukture,
- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture.

Fokusiranje na rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata društvene infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Izgrađena društvena infrastruktura do 2018. godine“

Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 3 – „Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura“.

Ključni prioriteti sektora zaštite životne sredine

Ključni prioriteti u sektoru zaštite životne sredine za 2017. godinu su:

- unapređenje sistema zaštite kvaliteta voda i izvorišta, te sistema zaštite od poplava,
- unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Fokusiranje na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne mreže i ostalih objekata vodosnabdijevanja treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta“.


Unapređenje sistema upravljanja otpadom treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Uspostavljen integralan sistem upravljanja otpadom“.

3. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRALNOG RAZVOJA

3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)

Strategijom razvoja grada Prijedora 2014-2024. godine planirana je realizacija **167** projekata, od čega je 162 projekta planirano prilikom izrade Strategije, dok je 5 projekata naknadno uvršteno u Strategiju, a čije uključnje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva. U periodu 2014-2017. godine započeta je realizacija 121 projekta, od kojih je 116 projekata višegodišnji, dok je 5 projekata jednogodišnji (čija je realizacija započeta i završena u jednoj godini). Od početka realizacije Razvojne strategije u potpunosti je završeno 22 projekata, što je 13 % od ukupno planiranih 167 projekata.

U nastavku je dat grafički prikaz implementacije broja projekata.

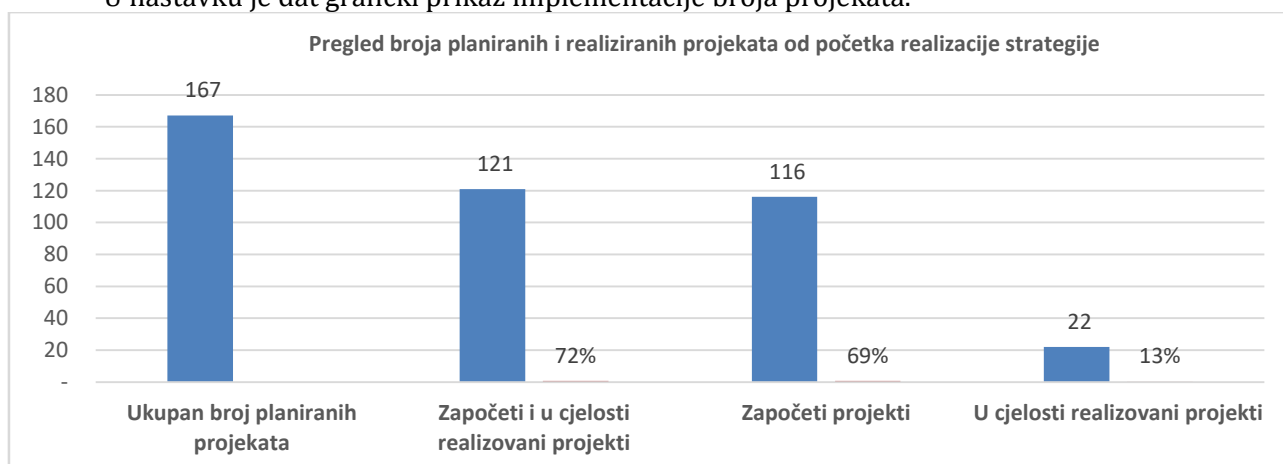


Ukupna vrijednost planiranih projekata od početka realizacije strategije je 101.685.633,00 KM, dok je vrijednost u potpunosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije 54.034.006,00 KM, što je 53 % od planirane vrijednosti projekata. Od toga, vrijednost

u potpunosti završenih projekata je 23.551.497,00 KM, što je 23% u odnosu na ukupnu vrijednost planiranih projekata.

U strukturi ukupne vrijednosti projekata čija je realizacija planirana za period 2014-17. godine predviđeno je da se iz budžeta Grada finansira 14.822.748,00 KM (15 %), dok je 86.862.885,00 KM (85 %) planirano iz eksternih izvora.

Kada je riječ o strukturi ukupne vrijednosti u potpunosti završenih projekata ili projekata koji su još uvijek u procesu realizacije u periodu 2014-17. godine, 10.585.386,00 KM (20%) je realizovano iz budžeta Grada, dok je 43.448.620,00 KM (80%) realizovano iz eksternih izvora. Pri tome u strukturi vrijednosti u potpunosti realizovanih projekata, iz budžeta Grada je realizovano 2.426.065,00 KM (10 %), a 21.125.432,00 KM (90 %) iz eksternih izvora.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske implementacije projekata.

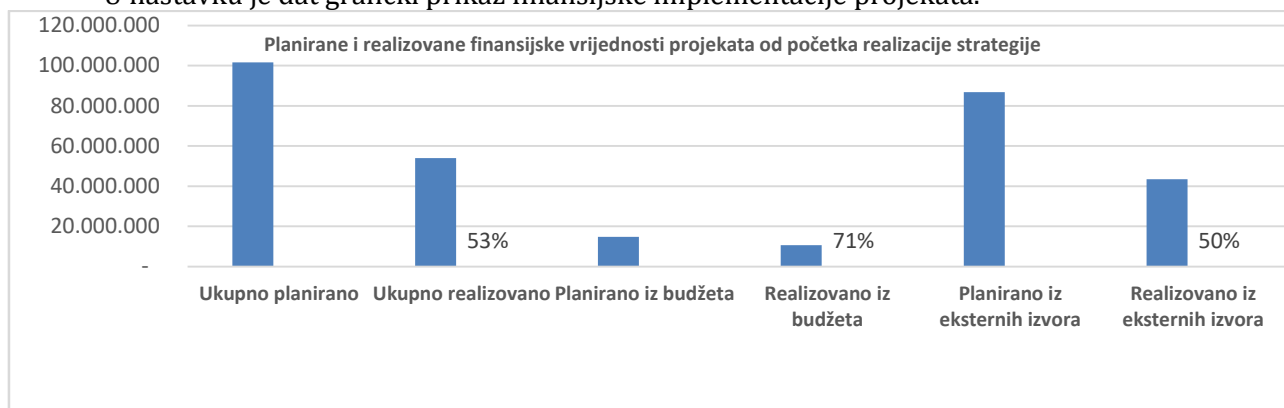


Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata od početka realizacije Strategije, može se zaključiti da je postignuta srednja realizacija. Osnovni razlog leži u činjenici da je realizacija najvećeg broja započetih projekata planirana tokom više godina.

3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2017. godini

Planom implementacije za 2017. godinu planirana je realizacija 103 projekata (u ukupnoj vrijednosti od 17.046.000,00 KM), od kojih su 61 višegodišnji projekti čija je realizacija započela u prethodnim godinama, dok se 42 projekata odnosi na jednogodišnje projekte ili projekte čija bi realizacija trebala da započne u 2017. godini.


U 2017. godini realizovano je ili se kontinuirano realizuje 62 projekta (u ukupnoj vrijednosti od 9.199.546,00 KM), od kojih je 8 projekata u potpunosti završeno. Od ukupnog broja projekata koji su u potpunosti završeni u 2017. godini, jedan je jednogodišnji projekat koji je započet i završen u toj godini, dok su ostali projekti započeti u prethodnim godinama.

U nastavku je dat grafički prikaz realizacije projekata u 2017. godini:

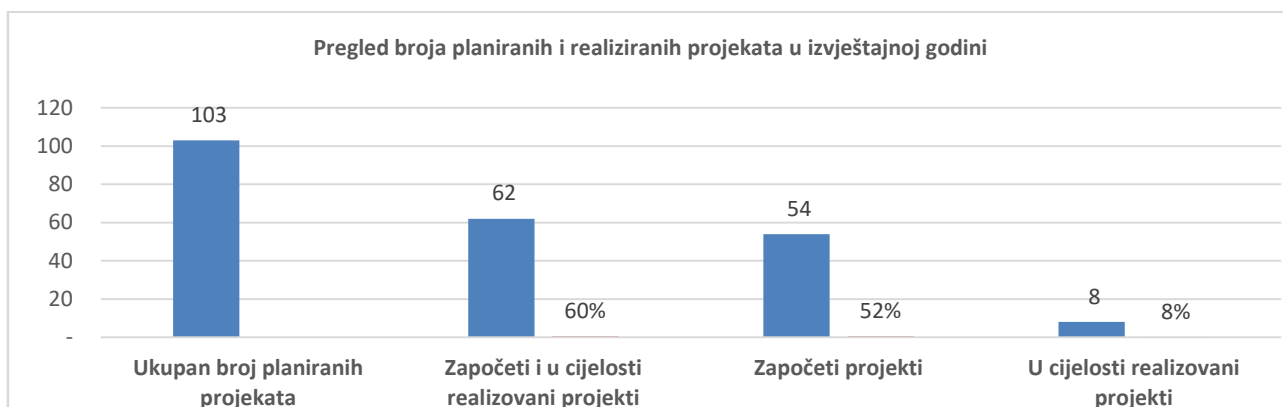

Kada je riječ o finansijskoj realizaciji, može se zaključiti da vrijednost realizovanih projekata u 2017. godini iznosi **54 %** u odnosu na planiranu vrijednost. Pri tome, u ukupnoj vrijednosti realizovanih projekata, 36 % se odnosi na finansiranje iz budžeta grada, dok je 64 % sredstava obezbijeđeno iz eksternih izvora finansiranja. Poredeći planiranu strukturu izvora finansiranja (gdje je u Planu implementacije za 2017. godinu iz budžeta Grada bilo predviđeno finansiranje projekata sa 22 %, a 78% iz eksternih izvora finansiranja). Na osnovu ovoga može se zaključiti da je iz budžeta Grada finansirano više nego što je planirano i da su budžetska sredstva bila usmjerena ka razvojnim projektima iz Strategije i da je finansiranje projekata iz eksternih izvora ostvareno nešto manje u odnosu na plan, ali opet na jednom visokom nivou, zahvaljujući predanom radu i sposobnostima lokalnog rukovodstva prema eksternim partnerima.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske realizacije po sektorima:

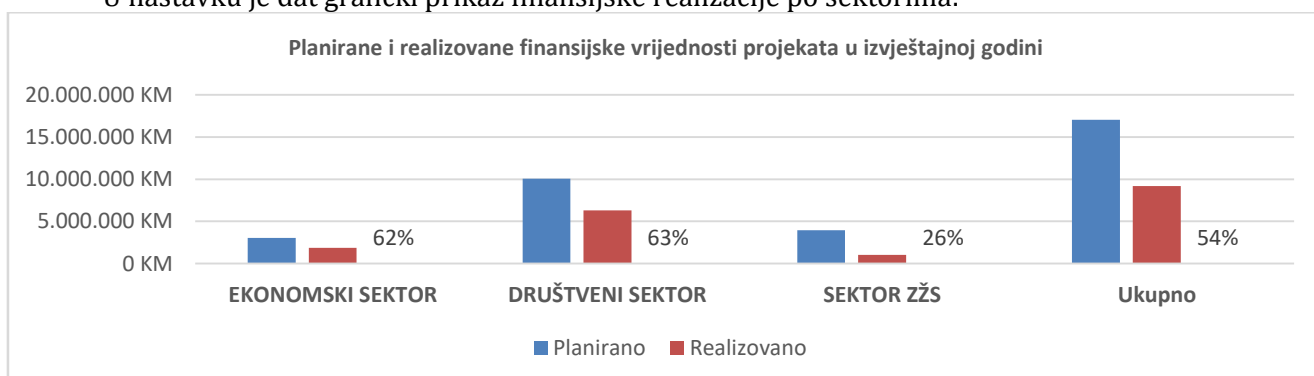

U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i po sektorima:

Tabela 1. Pregled planiranih i realizovanih projekata u 2017. godini (svi sektori)

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	103	17.046.000,00	3.763.040,00	13.282.960,00
% struktura finansiranja od A			22 %	78 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	62	9.199.546,00	3.296.573,00	5.902.973,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	60%	54%		
% struktura (od B)			36%	64%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	54	7.616.249	2.964.754,00	4.651.495,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	52%	44 %		
% struktura (od C)			39 %	61%
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	8	1.583.297,00	331.819,00	1.251.478,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	8%	9%		
% struktura (od D)			21%	79%

Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.

	Sektor	Zbirna finansijska vrijednost projekata		Struktura finansiranja realizovanih projekata	
		Planirano	Realizovano	Budžet (%)	Ostalo (%)
2016. godina	Ekonomski razvoj	3.030.200,00	1.876.513,00	54	46
	Društveni razvoj	10.066.090,00	6.298.607,00	31	69
	Ekološki razvoj	3.949.710,00	1.024.426,00	31	69
	Ukupno	17.046.000,00	9.199.546,00	36	64
	% po planu implementacije	100	54	22	78

Detaljna struktura izvora finansiranja za realizaciju navedenih projekata u 2017. godini data je u narednoj tabeli:

Tabela 3. Struktura izvora finansiranja

Izvor	Planirano	% ukupnog planiranog budžeta	Ostvareno	% ukupnog ostvarenog budžeta	Odnos ostvareno/planirano
1	2	3	4	5	6
Budžet JLS	3.763.040,00	22,08	3.296.573,00	35,83	87,60 %
Kredit	1.630.050,00	9,56	1.085.751,00	11,80	66,60 %
R. Srpska	3.007.500,00	17,65	2.563.136,00	27,86	85,22 %
BiH	0,00	0	0	0	0 %
Javna preduzeća	4.200.000,00	24,64	1.172.653,00	12,75	27,92 %
Privatni izvori	1.415.515,00	8,30	175.700,00	1,91	12,41 %
IPA	1.141.035,00	6,69	173.424,00	1,89	15,19 %
Donatori	1.230.360,00	7,22	727.809,00	7,91	59,15 %
Ostalo	658.500,00	3,86	4.500,00	0,05	0,68 %
Ukupno:	17.046.000,00	100,00	9.199.546,00	100,00	54 %

I Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2017. godinu planirana je realizacija 52 projekata, od kojih je 39 započeto u prethodnom periodu, te je planirana njihova realizacija i u 2017. godini, a za 13 projekata planirani početak realizacije je u 2017. godini. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od 3.030.200,00 KM, od čega je iz budžeta Grada planirano 1.476.340,00 KM, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od 1.553.860,00 KM.

U 2017. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 34 projekta, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od 1.876.513,00 KM, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno 1.003.972,00 KM, dok je iz eksternih izvora obezbijeden iznos od 872.541,00 KM.

Tabela 4. Pregled planiranih i realizovanih projekata u ekonomskom sektoru u 2017. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	52	3.030.200,00	1.476.340,00	1.553.860,00
% struktura finansiranja od A			49%	51%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	34	1.876.513,00	1.003.972,00	872.541,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	65%	62%		
% struktura (od B)			54%	46%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	34	1.876.513,00	1.003.972,00	872.541,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	65%	62%		
% struktura (od C)			54%	46%
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	0	0	0	0
% u potpunosti završenih projekata (od A)	0%	0%		
% struktura (od D)			0%	0%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti ekonomskog sektora u 2017. godini:

1. Izrada dokumenata prostornog uređenja za industrijske zone.

U 2017. godini u okviru ovog projekta bio je predviđen završetak Regulacionog plana poslovne zone "Baltin Bare" - Sekcija 1 i Sekcija 2 što je i izvršeno. Dio planiranih aktivnosti na izradi Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora i dio aktivnosti na izradi Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036. godina su izvršene u manjem obimu od planiranih.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 97.840,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini iz budžeta Grada je 49.266,00 KM.

2. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama.

U 2017. godini započela je realizacija projekta RAST, koji se odnosi na infrastrukturno uređenje poslovnih zona - "Izgradnja saobraćajnice C105 u IZ Celpak sa pratećom infrastrukturom" (donator projekta RAST je USAID, a implementator projekta zajedno sa Gradom je CRS).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 550.000,00 KM i to iz budžeta Grada 300.000,00 KM i 250.000,00 KM iz eksternih izvora. Realizovani iznos u

2017. godini je 300.000,00 KM i to iz budžeta Grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 200.000,00 KM.

3. Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača.

Iako su kroz ovaj projekat u 2016. godini dva gazdinstva snabdjevena sistemom za navodnjavanje, u 2017. godini nije bilo realizacije aktivnosti u okviru ovog projekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 50.000,00 KM i to iz budžet Grada 10.000,00 KM i iz eksternih izvora 40.000,00 KM.

4. Podrška podizanju plastenika i staklenika.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini podržano je ukupno 84 poljoprivredna proizvođača, i to putem Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2017. godini - 44 poljoprivredna proizvođača, a putem Programa "Podrška podizanju plastenika" (donatori ovog Programa su LDSC BiH i MAID BiH) - 40 poljoprivredna proizvođača.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 70.000,00 KM i to iz budžet Grada 40.000,00 KM i eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 155.354,00 KM, i to iz budžeta Grada 96.554,00 KM i eksternih izvora 58.800,00 KM.

5. Podrška podizanju novih zasada voća.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini nastavljena je realizacija projekta LIR "Sufinansiranje podizanja zasada malina-nabavka protivgradnih sistema mreža", kojim je podržano 39 poljoprivredna proizvođača (donator projekta je EU, a implementator zajedno sa Gradom je UNDP).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 40.000,00 KM i to iz budžet Grada 20.000,00 KM i iz eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 87.000,00 KM i to iz budžeta Grada 46.000,00 KM i iz eksternih izvora 41.000,00 KM.

6. Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju.

Iako je u 2016. godini kroz ovaj projekat podržano 89 poljoprivrednih proizvođača, u 2017. godini nije bilo realizacije aktivnosti u okviru ovog projekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 40.000,00 KM i to iz budžet Grada 20.000,00 KM i iz eksternih izvora 20.000,00 KM.

7. Podrška povećanju stočnog fonda.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini putem Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu podržana su 143 poljoprivredna proizvođača.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 100.000,00 KM i to iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 136.194,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

8. Izrada dokumenata prostornog uređenja za obuhvate u nacionalnom parku "Kozara"

Kroz ovaj projekat u 2017. godini implementiran je dio aktivnosti na izradi Regulacionog plana "Benkovac" (Odluka o pristupanju izradi Plana donesena je krajem 2016. godine) i početak aktivnosti na izradi Plana parcelacije "Pašini konaci".

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 16.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini iz budžeta Grada je 19.038,00 KM.

9. Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini Turistička organizacija grada Prijedora je realizovala projekat „Revitalizacija turističke signalizacije na području grada Prijedora“ – zamjena folija i oštećenih tabli na 27 lokacija sa ukupno 120 turističkih znakova, 2 city lighta i 1 bilborda.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 30.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 47.268,00 KM i to iz budžeta Grada 6.768,00 KM i iz eksternih izvora 40.500,00 KM iz izvora.

10. Kreiranje i podsticaj razvoja novih turističkih proizvoda

Kroz ovaj projekat u 2017. godini uz sredstva grada Prijedora i Turističke organizacije Republike Srpske započela je implementacija projekta „Avantura park“ na području NP Kozara, koji ima za cilj uređenje prostora sa različitim preprekama, odnosno platformama na stablima. Projekat je započeo u 2017. godini a potpuna realizacija projekta je planirana u 2018. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 15.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 19.460,00 KM i to iz budžeta Grada 11.000,00 KM i eksternih izvora 8.460,00 KM.

11. Promocija turističke ponude Prijedora i Kozare.

U 2017. godini Turistička organizacija grada Prijedora realizovala je projekte kojima je promovisala turističku ponudu Grada Prijedora i Kozare, a to su : „Turistička fotografija“, „Mali turisti“, „Dani zime na Kozari“ 2017. godine. , učešće na sajmovima turizma, izrada i štampanje promotivnog materijala i organizovanje manifestacija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 13.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 50.935,00 KM i to iz budžeta Grada 46.240,00 KM i iz eksternih izvora 4.695,00 KM.

12. Podrška inovacijama i investicijama u MSP.

U 2017. godini realizovan je projekat "Razvojem preduzetničke infrastrukture do boljeg poslovnog okruženja", finansiran od strane Grada i IRB RS (Finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2016/2017).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 10.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 24.110,00 KM, i to iz budžeta Grada 11.159,00 KM i iz eksternih izvora 12.951,00 KM.

13. Podrška poslovnim udruženjima i klasterima.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini podržano je Zanatsko preduzetničko udruženje Prijedor. Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 10.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 1.900,00 KM, iz budžeta Grada.

14. Podrška uvođenju standarda kvaliteta.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini podržano je uvođenje standarda kvaliteta kod jednog privrednog subjekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 13.000,00 KM i to samo iz budžet Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 3.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

15. Podrska internacionalnom povezivanju MSP.

U 2017. godini kroz ovaj projekat su podržane aktivnosti internacionalnog povezivanja lokalnih MSP.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 5.000,00 KM i to samo iz budžet Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 1.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

16. Uvođenje i . novih obrazovnih profila prema perspektivnoj potražnji na tržištu rada.

Planom implementacije 2016-2018. nije predviđena finansijska projekcija u 2017. godini za ovaj projekat, međutim, u okviru projekta „COTON“, koji implementira Agencija „PREDA-PD“, istovremeno se realizuju i aktivnosti na ovom projektu. Kroz projekat COTON, izvršena je analiza srednjih tehničkih škola na području prijedorske regije. Utvrđeni su kapaciteti škola i zainteresovanost preduzeća za prihvatanje učenika na praktičnu nastavu. Na osnovu toga, planirana je i odobrena druga faza realizacije ovog projekta koja se odnosi na povećanje kapaciteta srednjih stručnih škola prijedorske regije.

17. Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini zaključen je ugovor za realizaciju projekta "Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta", koji se finansira sredstvima IPA EU, uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada ILO u BiH.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 20.360,00 KM i to iz budžet Grada 11.000,00 KM i eksternih izvora 9.360,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 43.213,00 KM i to iz budžeta Grada 20.438,00 KM i iz eksternih izvora 22.775,00 KM.

18. Jačanje stručne prakse i praktične obuke

Aktivnosti na ovom projektu su podržane kroz aktivnosti projekta "Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave: Getting SMEs on board" koji implementira Agencija „PREDA-PD“. Projekat "Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave: Getting SMEs on board" je namjenjen unapređenju koncepta praktične nastave i kreiranju bolje, svrsishodnije veze između obrazovnog sistema i preduzeća koja žele dati doprinos stvaranju radne snage po mjeri poslodavca.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 40.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 316.376,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

19. Preduzetnička obuka za mlade.

U 2017. godini u ovoj obuci učestvovali su učenici završnih razreda pet srednjih škola sa područja grada Prijedora. U takmičenju je učestvovalo 300 učenika od čega su profesori preduzetništva uz podršku Agencije "PREDA-PD" odabrali 10 najboljih radova koji su nominovani za nagrade.

Tekuće školske godine u implementaciju projekta se uključilo 10 osnovnih škola sa područja grada Prijedora. U takmičenju je učestvovalo 30 učenika od čega su nastavnici odabrali najbolji biznis plan na nivou škole koji je nominovan za gradsko takmičenje.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 4.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 4.500,00 KM, iz budžeta Grada.

20. Izrada i realizacija akcionog plana za zapošljavanje.

Realizaciju ovog projekta vrši Razvojna agencija PREDA-PD, i za njegovu realizaciju nisu potrebna budžetska sredstva. Akcioni plan zapošljavanja u 2017. godini je urađen bez korištenja budžetskih sredstava JLS.

21. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini zaposleno je 111 nezaposlenih lica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 100.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 124.500,00 KM, iz budžeta Grada.

22. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini pružena je podrška poslodavcima za zapošljavanje troje mladih visokoobrazovanih kadrova.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 25.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 7.500,00 KM, iz budžeta Grada.

23. Podrška samozapošljavanju.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 27 nezaposlenih lica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 100.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 81.000,00 KM, iz budžeta Grada.

24. Podrška ženskom preduzetništvu.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 8 žena.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 9.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 24.000,00 KM, iz budžeta Grada.

25. Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija

U 2017. godini, u okviru ove mjere sadržana su 2 projekta: a) Razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena, gdje je podržano 6 žena (donator USAID, implementatori Grad i Institut za razvoj mladih KULT); b) Partnerstvo dijaspore i grada Prijedora u funkciji razvoja lokalne privrede.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 80.000,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 80.491,00 KM i to iz budžeta Grada 44.191,00 KM i iz eksternih izvora 36.300,00 KM.

26. Jačanje Fondacije za razvoj.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini realizovana sredstva se odnose na subvenciju kamata na odobrene kredite, koja je odobrena za 42 korisnika.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 120.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 93.124,00 KM, iz budžeta Grada.

27. Unapređenje i primjena GIS-a

Kroz ovaj projekat u 2017. godini kontinuirano se radi na upotpunjavanju i održavanju baze podataka, kako sa podacima koji se odnose na dokumente prostornog uređenja, tako i sa podacima koji se odnose na katastarske parcele na teritoriji grada po pojedinim katastarskim opštinama. U 2017.godini je bio predviđen nastavak aktivnosti na dopuni podataka koje se odnose na unošenje preostalih katastarskih parcela i opština u GIS bazu podataka. Takođe kad su u pitanju aktivnosti koje se odnose na dokumente prostornog uređenja, nastavljen je unos odgovarajućih podataka koji se odnose na završene dokumente prostornog uređenja i dokumente čija izrada je u toku, te stilizacija podataka za Web GIS aplikaciju, što je i više od planiranog obima aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 35.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 31.499,00 KM, iz budžeta Grada.

28. Jačanje kapaciteta u oblasti projektnog menadžmenta.

Realizaciju ovog projekta vrši Razvojna agencija PREDA-PD, i za njegovu realizaciju nisu potrebna budžetska sredstva. Tokom 2017. godine Agencija PREDA-PD je provodila obuke iz oblasti Projektnog menadžmenta sa grupom volontera.

29. Infrastrukturna podrška preduzetništvu.

Kroz ovaj projekat u 2017. godini realizovane su aktivnosti osnivanja Biznis inkubacionog centra Prijedora. U tom smislu, 11 poslovnih prostora je pušteno u upotrebu za fizička i pravna lica koja djeluju u oblasti kreativne industrije a u svrhu podrške otpocinjanja njihovih djelatnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 10.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 110.807,00 KM i to iz budžeta Grada 27.934,00 KM i iz eksternih izvora 82.873,00 KM.

30. Sajam privrede „PRIJEDOR INVEST“.

U 2017. godini je započela implementacija projekta " Partnerstvo dijaspore i grada Prijedora u funkciji razvoja lokalne ekonomije" u okviru projekta Dijaspore za razvoj i kojim je predviđeno da se u 2018. godini održi privredni forum koji će imati za cilj promovisanje lokalnih privrednih prilika u gradu Prijedoru i mogućnosti ulaganja dijaspore u Prijedor.

31. Podrška razvoju prehrambene industrije.

Aktivnosti na ovom projektu su podržane kroz aktivnosti projekta AGROTECH LAB, koji je kandidovan i odobren za realizaciju od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, čiji je cilj povezivanje obrazovnih institucija i privrede u agrobiznisu. Prijedorčanka AD je realizovala projekat u okviru Programa GIZ ProLocal, koji je za cilj imao podjelu sadnog materijala jagodičastog voća i organizacija otkupa.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 80.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 60.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 132.400,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

32. Podrška razvoju metaloprerađivačke i mašinske industrije.

Aktivnosti na ovom projektu su podržane u okviru mjere 4. EU ProLocal Programa kojim je u 2017. godini preduzeće Cromex d.o.o. nabavilo mašinu i na taj način se omogućilo zapošljavanje novih radnika. Tokom 2016. godine je izdefinisana i odobren projektni prijedlog koji se odnosi na nastavak aktivnosti poboljšanja praktične nastave u Mašinskoj školi, obzirom da su u prethodnom periodu urađeni znatni pomaci na obezbjeđenju uslova za adekvatnije izvođenje praktične nastave (Do sad obezbjeđeno: CNC mašina za obradu drveta, CNC simulatori za metal, auto – dijagnostika, 3D printer/štampač, CAM/CAD softver).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 70.000,00 KM i to iz budžeta Grada 10.000,00 KM i eksternih izvora 60.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 259.695,00 KM i to iz budžeta Grada 6.323,00 KM, a iz eksternih izvora 253.372,00 KM.

33. Podrška razvoju drvoprerađivačke industrije.

U 2017. godini u okviru poziva Programa EU ProLocal realizovani su projekti preduzeća Karpenterer Vitorog d.o.o., Javor d.o.o. i Gavranović d.o.o. (nabavka opreme). Za potrebe istog poziva (mjera 4.) formirano je partnerstvo Agencije PREDA, Klastera DRVO-PD i preduzeća: Javor d.o.o., Masterwood d.o.o. i Gavranović d.o.o., koje je podnijelo zajednički prijedlog projekta.

Od 1.1.2017. god. u implementaciji je projekat "Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvoprerađivačkim djelatnostima - FORESDA". Cilj projekta je podrška razvoju međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na drvoprerađivačkim djelatnostima (razvoj kooperativnih odnosa između tradicionalnih drvoprerađivačkih djelatnosti i drugih sektora - prvenstveno ICT). Pripremljena je analiza lokalne drvoprerađivačke djelatnosti i mapiranje subjekata u skladu sa metodologijom projekta. Pripremljen je plan aktivnosti koji će se realizovati kroz pilot projekat u 2018/2019. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 80.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 60.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 504.521,00 KM i to iz budžeta Grada 7.007,00 KM, a iz eksternih izvora 497.514,00 KM.

34. Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti

U novembru 2017. godine je startovao projekat "Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja "MOS-LER". U realizaciji učestvuju predstavnici svih navedenih lokalnih zajednica i Agencije PREDA (vodeći partner).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 80.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 60.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 3.837,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Pored navedenih projekata postoji još nekoliko projekata čija je realizacija u 2017. godini predviđena Planom implementacije 2016-2018, ali iz određenih razloga (nedostatka finansijskih sredstava) isti nisu realizovani.

II Sektor društvenog razvoja

U sektoru društvenog razvoja za 2017. godinu planirana je realizacija 27 projekata, od kojih je 16 započeto u prethodnom periodu, te je planirana njihova realizacija i u 2017. godini, a za 11 projekata planirani početak realizacije je u 2017. godini. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od 10.066.090,00 KM, od čega je iz budžeta Grada planirano 1.703.990,00 KM, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od 8.362.100,00 KM.

U 2017. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 19 projekata, a završeno je 5 projekata iz ovog sektora. Za realizaciju navedenih projekata utrošena su sredstva u iznosu od 6.298.607,00 KM, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno 1.970.247,00 KM, dok je iz eksternih izvora obezbijeđen iznos od 4.328.360,00 KM.

Tabela 5. Pregled planiranih i realizovanih projekata u društvenom sektoru 2017. godini.

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz Budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	27	10.066.090,00	1.703.990,00	8.362.100,00
% struktura finansiranja od A			17%	83%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	19	6.298.607,00	1.970.247,00	4.328.360,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	70%	63%		
% struktura (od B)			31%	69%
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	14	5.374.304,00	1.683.170,00	3.691.134,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	52%	53%		
% struktura (od C)			31%	69%
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	5	924.303,00	287.077,00	637.226,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	19%	9%		
% struktura (od D)			31%	69%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti društvenog sektora u 2017. godini:

1. **Rekonstrukcija objekata za obavljanje stručne prakse učenika u srednjim školama**

U 2017. godini izvršeno je opremanje kabineta JU Elektrotehnička škole čime je poboljšana kvaliteta nastave u ovoj školi i opremanje kabineta JU OŠ "Petar Kočić" Prijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 150.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 16.302,00 KM i to samo iz budžeta Grada 16.302,00 KM.

2. *Rekonstrukcija zgrade Gimnazije „Sveti Sava „ Prijedor.*

Rekonstrukcija na objektu Gimnazije "Sveti Sava" počela je u aprilu 2017. godini. Izvršena je rekonstrukcija krova, zamijenjena stolarija i fasada na zgradi. Projekat je energetske efikasnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 400.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 380.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 257.896,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i iz eksternih izvora 237.896,00 KM.

3. *Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata osnovnih škola.*

U 2017. godini nabavljena je pumpa za vodu u JU Osnovna škola "Branko Radičević" Petrovo, JU Osnovna škola "Jovan Cvijić" Brezičani izgradnja i uređenje dječijeg igrališta u PO Cikote, JU OŠ "Kozarac", Kozarac nabavljena i ugrađena hidrantna oprema, nabavka opreme za produženi boravak učenika u JU OŠ "Dositej Obradović", nabavka opreme za produženi boravak učenika u JU OŠ "Petar Petrović Njegoš", nabavka opreme za produženi boravak učenika u JU OŠ "Vuk Karadžić" Omarska, nabavka opreme za produženi boravak učenika u JU OŠ "Branko Radičević" Petrovo, JU OŠ "Branko Radičević" Petrovo izgradnja pristupne rampe, JU OŠ "Petar Kočić" radovi na centralnom grijanju, JU OŠ "Branko Ćopić" Prijedor instaliranje solarnih panela, JU OŠ "Ćirilo i Metodije" sanacija objekta PO Gornji Garevci, renoviranje učionice u JU OŠ "Ćirilo i Metodije" Trnopolje - PO Gornji Garevci.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 193.990,00 KM i to iz budžeta Grada 73.990,00 KM i eksternih izvora 120.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 18.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada 18.500,00 KM.

4. *Rekonstrukcija domova kulture.*

U 2017. godini su izvedeni radovi na sanaciji kancelarija u društvenom domu u Rakelićima, izrada i postavljanje zaštitne ograde kod doma MZ Raškovac, MZ G. Puharska, MZ G. Orlovci, adaptacija velike sale MZ Raškovac, nadogradnja i popravka žice na ogradi sportskog igrališta kod Doma MZ Č. Polje, izvođenje radova u prostorijama doma MZ Omarska i izvođenje radova na vanjskom uređenju objekta MZ Marička.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 70.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 44.266,00 KM, iz budžeta Grada.

5. *Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju Urije.*

U okviru ovog projekta u 2017. godini realizovani su slijedeći radovi : fasadna stolarija i niski krovovi sa odvodima.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 500.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizacijom istog u 2017. godini iz budžeta Grada izdvojeno je 1.111.000,00 KM.

6. *Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje*

U okviru ovog projekta u 2017. nastavljani su radovi na izgradnji zgrade na Pećanima sa 50 stambenih jedinica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godinu je 1.180.000,00 KM, od čega iz budžeta Grada 430.000,00 KM i iz eksternih 750.000,00 KM. Realizovani iznos u

2017. godini je 2.363.229,00 KM, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno 40.989,00 KM i iz eksternih izvora 2.322.240,00 KM.

7. Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja u Prihvatnoj stanici.

Kroz ovaj projekat proveden je niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja, te se kontinuirano radi na pružanju savjetodavnih usluga porodicama i pojedincima žrtvama porodičnog nasilja kroz koordinaciju usluga službe u zajednici. U 2017. godini izvršena je nabavka obuće, odjeće, didaktičkog materijala, higijenskih potrepština, lijekova i troškova smještaja korisnika.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 10.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 6.605,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

8. Digitalizacija televizije Prijedor.

Grad Prijedor je u toku 2017. godine podržao proces digitalizacije RTV Prijedor kroz nabavku opreme za digitalizaciju.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 180.000 KM i to iz budžeta Grada 40.000,00 KM i iz eksternih izvora 140.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 100.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

9. Prijedor grad murala.

U 2017. godini urađen je peti mural u okviru 5. Međunarodnog konkursa "Paola de Manjinkor" - Mural pod nazivom "Negdje između početka i kraja" (zid JU OŠ "Desanka Maksimović" Prijedor).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti izrade murala u gradu Prijedoru u 2017. godini je 11.500,00 KM i to iz budžeta Grada 1.500,00 KM i iz eksternih izvora 10.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 12.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada 3.500,00 KM i iz eksternih izvora 9.000,00 KM.

10. Unapređenje kulturnih aktivnosti.

U 2017. godini na području grada Prijedora se realizovalo nekoliko značajnih kulturnih manifestacija: Međunarodni festival horova "Zlatna Vila", Književni susreti na Kozari, Likovna kolonija i Prijedorsko kulturno ljeto.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 60.000 KM i to iz budžeta Grada 30.000,00 KM i iz eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 144.308,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

11. Rekonstrukcija postojeće vodovodne i distributivne mreže.

U 2017. godini završena je izgradnja vodovodne mreže i u toku je priključenje 85 domaćinstava u naselju Janjića pumpa i Volar-Jugovci.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 900.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 679.955,00 KM i to iz budžeta Grada 42.769,00 KM i iz eksternih izvora 637.226,00 KM.

12. Izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog sistema "Crno Vrelo".

U okviru ovog projekta potpisan je Ugovor između izvođača radova Hidro-kop Banja Luka, s jedne i grada Prijedora i Banja Luka, s druge strane, za završetak vodovodnog sistema Crno vrelo (izgradnja fabrike vode) i puštanja sistema u rad. Izvođenje radova se nastavlja i u 2018. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 364.313,00 KM i to iz budžeta Grada 18.834, 00 KM i iz eksternih izvora 345.479,00 KM.

13. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u užim gradskim područjima i izmještanje u putnu zonu.

Ovim projektom u 2017. godini je rekonstruisano oko 17 km niskonaponske mreže.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 500.000,00 KM iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 244.460,00 KM iz istog izvora.

14. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u seoskim područjima i izmještanje u putnu zonu.

Ovim projektom do 2017. godine je rekonstruisano oko 30 km niskonaponske mreže.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 800.000,00 KM iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 349.155,00 KM iz istog izvora.

15. Izgradnja NN mreža za potrebe novih naselja.

Ovim projektom do 2017. godine je rekonstruisano oko 3,3 km niskonaponske mreže.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 1.500.000,00 KM iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 32.960,00 KM iz istog izvora.

16. Rekonstrukcija 6,3 Kv rasklopnica i trafo stanica i prebacivanje na 20 kV napon Ljubija-Tomašica.

Ovim projektom do 2017. godine su rekonstruisane četiri trafo stanica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 800.000,00 KM iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 77.003,00 KM iz istog izvora.

17. Rekonstrukcija 6,3 Kv dalekovoda i prebacivanje na 20 kV napon Ljubija-Tomašica.

Ovim projektom do 2017. godine je rekonstruisano oko 11 km srednjonaponske mreže.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 600.000,00 KM iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 65.681,00 KM iz istog izvora.

18. Uspostavljanje baze podataka o dijaspori Prijedora.

U 2017. godini je započela implementacija projekta " Partnerstvo dijaspore i grada Prijedora u funkciji razvoja lokalne ekonomije" u okviru projekta Dijaspore za razvoj i kojim je

predviđeno da se u 2018. godini kreira web platforma koja bi predstavljala bazu podataka o prijedorskoj dijaspori koja će imati za cilj promovisanje loklanih privrednih prilika u gradu Prijedoru i mogućnosti ulaganja dijaspore u Prijedor.

19. Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma u Prijedoru.

Realizacijom ovog projekta biće obezbijeđeni bolji uslovi rada za zaposleneu TVJ. Očekuje se da će nakon dogradnje garažni prostor povećati za 580 m². Vrijeme izlaska vozila prema južnom i jugozapadnom dijelu grada biće značajno smanjeno. U 2017. godini su započeti radovi na vatrogasnom tornju, rekonstrukciji postojećeg objekta, kao i dijelu novih garaža za smještaj vozila. Kompletni radovi na ovom projektu nisu mogli otpočeti zbog ne rješelog preseljavanja i rušenja montažnog objekta Crvenog Krsta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 400.000 KM i to iz budžeta Grada 200.000,00 KM i iz eksternih izvora 200.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 300.174,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Pored navedenih projekata postoji još nekoliko projekata čija je realizacija u 2017. godini predviđena Planom implementacije 2016-2018, ali iz određenih razloga (nedostatka finansijskih sredstava) isti nisu realizovani.

III Sektor zaštite životne sredine

U sektoru zaštite životne sredine u 2017. godini planirana je realizacija **24** projekata, od kojih je 6 započeto u prethodnom periodu, te je planirana njihova realizacija i u 2017. godini, a za 18 projekata planirani početak realizacije je u 2017. godini. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od 3.949.710,00 KM, od čega je iz budžeta Grada planirano 582.710,00 KM, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od 3.367.000,00 KM.

U 2017. godini u potpunosti su završena 3 projekta iz ovog sektora, a djelimično je realizovano 9 projekata, tako da se njihova realizacija nastavlja i u narednim godinama. Za realizaciju navedenih projekata utrošena su sredstva u iznosu od 1.024.426,00 KM, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno 322.354,00 KM, dok je iz eksternih izvora obezbijeđen iznos od 702.072,00 KM.

Tabela 6. Pregled planiranih i realizovanih projekata u sektoru zaštite životne sredine u 2017. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz Budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	24	3.949.710,00	582.710,00	3.367.000,00
% struktura finansiranja od A			15%	85%
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	9	1.024.426,00	322.354,00	702.072,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	38%	26%		
% struktura (od B)			31%	69%

C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	6	365.432,00	277.612,00	87.820,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	26%	9%		
% struktura (od C)			76%	24%
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	3	658.994,00	44.742,00	614.252,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	13%	17%		
% struktura (od D)			7%	93%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti sektora zaštite životne sredine u 2017. godini:

1. Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi.

Ovim projektom do 2016. godine izgrađeno je 11 kilometara sekundarne kanalizacione mreže Grada, a u 2017. godini rekonstruisan je dio primarne mreže u Tukovima i rekonstruisana ulica Tode Švrakića.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 1.360.000,00 KM i to iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 651.872,00 KM i to iz budžeta Grada 37.620,00 KM i iz eksternih izvora 614.252,00 KM.

2. Zoning plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora.

U 2017. godini je sproveden dio pripremnih i početnih aktivnosti na izradi Zoning plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 109.780 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2017. godini je 18.770,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

3. Izrada regulacionog plana područja uz korita rijeka Sana i Gomjenica-Sekcija 1 i Sekcija 2.

U skladu sa Planom rada Odjeljenja i Planom Implementacije 2016-2018 izvršene su sve planirane aktivnosti koje se odnose na ovaj projekat. Utvrđen je nacrt i javni uvid, te formiran prijedlog Plana i njegovo usvajanje. Propisane aktivnosti na izradi Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području Prijedora - Sekcija 1 i Sekcija 2 završene su krajem 2016. godine kada je usvojen Plana a bez dostave elaborata Plana. Isti je dostavljen u prvoj polovini 2017. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 14.180,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos iz budžeta Grada je 7.122,00 KM.

4. Snimanje stanja i kontrola kvaliteta lokalnih vodovoda.

U 2017. godini urađen je elaborat o upravljanju, održavanju i rekonstrukciji lokalnih vodovoda. Identifikovana su 132 lokalna vodovoda, a u sklopu projekta „Izgradnja i

rekonstrukcija objekata romske populacije“ izbušena su dva bunara dubine 20 m (u Ćeli) za priključak na vodu domaćinstava romske populacije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 25.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos iz budžeta Grada je 34.000,00 KM.

5. Uređenje korita rijeke Sane od Manastira Klisina do naselja Brežičani.

U 2017. godini urađena je projektna dokumentacija.

6. Realizacija etapnog plana Rudnika "Omarska" u oblasti izgradnje infrastrukture i zaštite životne sredine.

U 2017. godini u okviru ovog projekta urađeni su značajni infrastrukturni radovi, i to u različitim infrastrukturnim oblastima. U oblasti životne sredine i zelenih površina uspostavljen je monitoring svih elemenata životne sredine i izgrađen je sistem za odvodnjavanje atmosferskih taloga.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 289.000,00 KM iz eksternog izvora. Realizovani iznos u 2017. godini je 70.000,00 KM iz istog izvora.

7. Zamjena običnih sijalica štednim na objektima javnih ustanova privrednih subjekata i na stambenim objektima.

Realizacijom ovog projekta u 2017. godini se poboljšao kvalitet javne rasvjete i postigla se ušteda električne energije (kroz plan redovnog održavanja izvršena je zamjena običnih sijalica štednim-250 komada, a investiciona ulaganja izvršena su u Ljetnoj bašti, ul. Krajiškig brigada, ul. V. Korpusa, ul. Svetozara Tucovića, ul. Brastva i jedinstva.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 150.000 KM i to iz budžeta Grada 40.000,00 KM i iz eksternih izvora 110.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 91.092,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

8. Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete u Prijedoru.

U 2017. godini izgrađena je nova ulična rasvjeta u ul. Vuka Karadžića (sa ugrađenim štednim sijalicama), poboljšan kvalitet javne rasvjete i smanjeni su troškovi električne energije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti iz ovog projekta u 2017. godini je 210.000 KM i to iz budžeta Grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 110.000,00 KM. Realizovani iznos u 2017. godini je 130.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

9. Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti.

U okviru projekta SISMA (finansiran kroz Interreg Mediteranski program EU), realizovane aktivnosti koje se odnose na analizu okruženja sa aspekta realizacije ESCO projekata u BiH kao i izrada alata koji služi za izračun najekonomičnijeg načina finansiranja EE projekata u smislu odnosa izvora finansiranja (kredit/subvencija/privatno ucesce). U toku 2018. godine planirane su aktivnosti koje se odnose na organizaciju Energetskih dana.

Pored navedenih projekata postoji još nekoliko projekata čija je realizacija u 2017. godini predviđena Planom implementacije 2016-2018, ali iz određenih razloga (nedostatka finansijskih sredstava) isti nisu realizovani.

3.3. Ključni rezultati i ostvareni napredak

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u 2017. godini može se zaključiti da se ostvareni rezultati u navedenoj godini prvenstveno ogledaju u realizaciji krupnih infrastrukturnih projekata koji se odnose na sanaciju postojeće i izgradnju nove fizičke infrastrukture (vodovodne, kanalizacione, saobraćajne i elektro infrastrukture) i ostale društvene infrastrukture (sanacija postojećih i izgradnja novih objekata u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite, sporta i dr). Pored toga ostvareni su značajni rezultati na realizaciji podsticajnih mjera u ekonomskom skтору, te na unapređenju društvenih usluga građanima Prijedora.

U 2017. godini najveći napredak je ostvaren u društvenom sektoru realizacijom nekoliko projekata (Rekonstrukcija domova kulture, Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju Urije, Rekonstrukcija postojeće vodovodne i distributivne mreže, Izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog podsistema „Crno Vrelo“, Rekonstrukcija postojeće NN mreže u užim gradskim područjima i izmještanje u putnu zonu, Rekonstrukcija postojeće NN mreže u seoskim područjima i izmještanje u putnu zonu, Izgradnja NN mreže za potrebe novih naselja, „Rekonstrukcija 6,3 Kv rasklopnica i trafo stanica i prebacivanje na 20 kV napon Ljubija i Tomašica, Rekonstrukcija 6,3 Kv dalekovoda i prebacivanje na 20 kV napon Ljubija i Tomašica, Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma u Prijedoru, Rekonstrukcija zgrade Gimnazije „Sveti Sava „Prijedor, Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje i drugi.

Za realizaciju navedenih projekata u 2017. godini utrošena su sredstva u iznosu od 6.298.607,00 KM, od čega je obezbjeđeno 1.970.247,00 KM iz budžeta Grada, a 4.328.360,00 KM iz eksternih izvora.

Obzirom da se radi o četvrtoj godini implementacije Strategije i da je veliki broj projekata tek započeo u 2016. i 2017. godini, ne može se govoriti o značajnom doprinosu u ostvarenju postavljenih strateških ciljeva. Planom implementacije predviđen je veliki broj mjera (naročito u ekonomskom i društvenom sektoru), koje će se implementirati i u narednim godinama, pa u ovom trenutku podaci o realizaciji ne mogu jasno ukazati na ostvareni napredak, niti značajno ostvarenje sektorskih ciljeva.

Na osnovu indikatora, koji su u Strategiji razvoja definisani na sektorskom nivou, u narednom dijelu izvještaja dat je pregled ostvarenih rezultata i napretka po sektorima.

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1: Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone do 2019. Godine

Rezultati i napredak u ostvarenju ovog cilja ekonomskog razvoja se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Najmanje dvije trećine lokacija i IZ „Celpak“ i jedna trećina lokacija u IZ „Čirkin polje“ stavljeno u funkciju do kraja 2018. godine;

- Kompletirana prostorno planska dokumentacija i riješeni imovinsko pravni odnosi za 3 nove poslovne zone;
- Urađena ključna infrastruktura i otpočete poslovne aktivnosti u 3 nove poslovne zone.

Očekivani ishod u 2017. godini: Donošenje Odluke o usvajanju RP poslovne zone "Baltin Bare" Sekcija 1 i Sekcija 2 i donošenje Zaključka o utvrđivanju Nacrta ZP Južnog dijela urbanog područja Prijedora i zaključka o utvrđivanju Nacrta Urbanističkog plana Ljubija 2016-2036.

Realizacija u 2017. godini: U 2016. godini završen je Regulatorni plan poslovne zone „Baltin Bare“ – Sekcija 1 i Sekcija 2 i donešena je odluka o usvajanju. Takođe, definisan je prednacrt Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036.godine.

Sektorski cilj 2: Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja ekonomskog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Rast broja poljoprivrednih gazdinstava u 2018. od najmanje 15% u odnosu na 2013. godinu;
- Rast broja zaposlenih u poljoprivredi u 2018. od najmanje 15% u odnosu na 2013. godinu.

Očekivani ishod u 2017. godini: Povećani kapaciteti u poljoprivredi sa povećanjem broja gazdinstava za 3%.

Realizacija u 2017. godini: U 2017. godini povećan je broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u odnosu na prethodnu godinu (sa 1064 na 1127 gazdinstava) i ostvaren je očekivani ishodi u povećanju broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Sektorski cilj 3: Poboljšanje turističke ponude grada Prijedora, prvenstveno na području Nacionalnog parka „Kozara“

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja ekonomskog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Rast prihoda u sektoru turizma i ugostiteljstva od najmanje 20% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Rast broja zaposlenih u sektoru turizma i ugostiteljstva od najmanje 15% u 2018. u odnosu na 2013. godinu.

Očekivani ishod u 2017. godini: Unapređene procedure relevantne za privlačenje investicija i uređena dva turistička lokaliteta u 2017. Nastavak izrade Regulatornog plana "Benkovac", utvrđivanje nacrta Plana i donošenje Odluke o pristupanju izradi Regulatornog plana "Pašini konaci".

Realizacija u 2017. godini: U 2017. godini organizovan je javni uvid i javna rasprava a zatim usvojena Odluka o donošenju Plana. Donešena je i odluka pristupanju izradi Plana parcelacije "Pašini konaci" i izvršena je javna nabavka za nosioca izrade Plana i geodetske radove.

Sektorski cilj 4: Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja ekonomskog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Rast prihoda u MSP od najmanje 25% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Rast broja zaposlenih u privredi od najmanje 20% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Rast broja novopokrenutih radnji i preduzeća od najmanje 15% u 2018. u odnosu na 2013. godinu.

Očekivani ishod u 2017. godini: Podržano samozapošljavanje najmanje 50 nezaposlenih lica, podržano zapošljavanje najmanje 80 novih radnika kod poslodavaca i unapređeno poslovanje 5 preduzeća.

Realizacija u 2017. godini: U 2017. godini nastavljena je tendencija unapređenja konkurentnosti MSP, podrške preduzetništvu i zapošljavanju novih radnika kroz isplatu podsticajnih sredstava iz budžeta grada Prijedora. Naime, radi se o sledećim podsticajnim sredstvima :

- Kroz podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika zaposleno je 111 novih radnika,
- Kroz podršku samozapošljavanju podržano je 27 nezaposlenih lica,
- Kroz podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija) podržan je jedan poslovni subjekat,
- Kroz podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova zaposlena su tri mlada visokoobrazovana kadra,
- Kroz podršku ženskom preduzetništvu podržano je 8 nezaposlenih žena.

U 2017. godini za ove namjene iz budžeta grada Prijedora isplaćena su podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 240.000,00 KM.

Sektorski cilj 5: Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja ekonomskog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Rast broja zaposlenih u rudarstvu od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Stalan rast privrednih ulaganja dijaspore u periodu od 2014. do 2018. godine.

Očekivani ishod u 2017. godini: Rast broja zaposlenih u rudarstvu od najmanje 10% u 2017. u odnosu na 2013. godinu i rast privrednih ulaganja dijaspore za 3% u odnosu na 2016. godinu.

Realizacija u 2017. godini: U 2017 .godini nije došlo do povećanja broja zaposlenih u rudarstvu, odnosno broj zaposlenih u rudarstvu u 2017. godini u odnosu na 2013. godinu se smanjio za 15 radnika.

Kada su u pitanju privredna ulaganja dijaspore, u 2017. godini kao i u prethodnim godinama postoji kontinuitet ulaganja dijaspore u lokalnu privredu, s tim da se ne postoje zvanični podaci koji je iznos tih investicija.

Kroz realizaciju naprijed navedenih ciljeva ekonomskog razvoja djelimično se ostvaruje strateški cilj 1 – Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja.

Društveni razvoj

Sektorski cilj 1: Izgrađena društvena infrastruktura do 2018. godine

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja društvenog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Najmanje 10 objekata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja rekonstruisano i izgrađeno, do kraja 2018.
- Povećan broj studnata na visokoškolskim institucijama u Prijedoru do kraja 2018. za najmanje 15% u odnosu na 2013.
- Povećan broj korisnika kulturnih usluga i sadržaja do kraja 2018. za najmanje 15% u odnosu na 2013.
- Povećan broj korisnika sportskih objekata i sadržaja do kraja 2018. za najmanje 15% u odnosu na 2013.
- Poboljšana dostupnost, sadržaj i uslovi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga do kraja 2018.

Očekivani ishod u 2017. godini: Rekonstrukcija objekata srednjih škola, povećan broj korisnika kulturnih usluga i sadržaja, povećan broj korisnika sportskih objekata i sadržaja.

Realizacija u 2017. godini: Oblast obrazovanja je u Strategiji razvoja prepoznata kao jedna od najvažnijih oblasti u okviru društvenog sektora. U 2017. godini rekonstruisana je JU Gimnazija "Sveti Sava". Realizacijom ovog projekta biće stvoreni bolji uslovi za rad profesora i učenika osnovnih škola u Prijedoru, a povećaće se i energetska efikasnost škole.

Zahvaljujući ulaganjima u objekte kulture broj korisnika kulturnih usluga i sadržaja se znatno povećao u odnosu na prošlu godinu. U 2017. godini izrađen je četvrti mural "Paola de Maninkor" pod nazivom "Negdje između početka i kraja", čime je stvoren ljepši izgled grada. Izvršen je dio građevinskih radova na Sportskoj dvorani na Urijama.

Kroz realizaciju naprijed navedenih ciljeva društvenog razvoja djelimično (ili potpuno) se ostvaruje strateški cilj 3 – „Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšanje kvaliteta života građana“.

Sektorski cilj 2: Unaprijeđene društvene usluge građanima

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja društvenog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Rast zadovoljstva korisnika usluga u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Rast zadovoljstva korisnika usluga u oblasti kulture i informisanja od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu.

Očekivani ishod u 2017. godini: Povećan obuhvat zdravstvene zaštite za 2% u 2017. u odnosu na 2016. godinu, smanjen broj korisnika socijalne zaštite za 2% u 2017. u odnosu na

2016. godinu, povećan broj prisustva građana za 10% u kulturnim ustanovama u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu.

Realizacija u 2017. godini: U 2017. godini nije uspostavljen mehanizam mjerenja zadovoljstva korisnika usluga u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao ni u oblasti kulture i informisanja. Zbog toga se predlaže da se ostvarenje ovog cilja društvenog razvoja mjeri preko sljedećih indikatora:

- Povećanje broja (obuhvata) korisnika zdravstvene zaštite,
- Smanjenje broja korisnika socijalne zaštite,
- Povećanje broja korisnika usluga u oblasti kulture i informisanja.

Sektorski cilj 3: Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja društvenog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Rast zadovoljstva korisnika komunalnih usluga od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Povećan broj korisnika usluga vodosnabdijevanja za oko 8.000 do kraja 2018. godine;
- Rast zadovoljstva korisnika usluga snabdijevanja električnom energijom od najmanje 10% u 2018. u odnosu na 2013. godinu;
- Znatno smanjeno saobraćajno opterećenje u gradu (do 2018.) i poboljšana povezanost sa Banjom Lukom i K. Dubicom, do 2022. godine.

Očekivani ishod u 2017. godini: Nastaviti sa proširenjem područja prikupljanja komunalnog otpada, a s tim i povećanja broja korisnika komunalnih usluga. Takođe nastaviti rekonstrukciju i proširenje vodovodne mreže uz povećanje broj korisnika usluga.

Realizacija u 2017. godini: U 2017 godini povećan je broj korisnika vodosnabdijevanja za 100, a korisnika komunalnih usluga za 363 korisnika. Izvršeno je ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu u iznosu od 1.955.110 KM (rekonstruisana je ul.Vuka Karadžića kao i pristupni putevi u ovoj ulici, a takođe je izvršena i rekonstrukcija dijela ul. N.Pašića sa obostranim trotoarima i ul.bTode Švrakića). Završena je izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog podsistema "Crno Vrelo" i primarne kanalizaciona mreža u naselju Tukovi.

U 2017. godini nije uspostavljen mehanizam za praćenje zadovoljstva korisnika usluga snabdijevanja električnom energijom, pa bi bilo dobro da se ostvarenje ovog cilja društvenog razvoja (u dijelu koji se odnosi na unapređenje elektroenergetske infrastrukture), prati preko drugih indikatora (npr: preko nivoa ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu).

Kroz realizaciju naprijed navedenih ciljeva društvenog razvoja djelimično se ostvaruje strateški cilj 2 (SC2) – „Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura“.

Sektor zaštite životne sredine

Sektorski cilj 1: Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja ekološkog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Novoizgrađenom kanalizacionom mrežom pokriveno oko 5.000 domaćinstava do kraja 2017. godine;
- Gradski kanalizacioni sistem rekonstruisan i kompletiran do 2020. godine;
- Usvojen novi program sanitarne zaštite izvorišta pitke vode i obavljanja poljoprivredne djelatnosti u tim zonama do kraja 2017. godine;
- Smanjenje štete od poplava za najmanje 30% u periodu 2017.-2018. u odnosu na period 2014.-2015. godina.

Očekivani ishod u 2017. godini: Donešena Odluka o pristupaju izradi Zoning plana sjevero-zapadnog dijela urbanog područja Prijedora. Usvojen program sanitarne zaštite na sjednici Skupštine Grada.

Realizacija u 2017. godini: Donešna je Odluka o pristupanju izradi Zoning plana sjevero-zapadnog dijela urbanog područja Prijedora i imenovan Savjet za izradu Plana. Programi sanitarne zaštite izvorišta pitke vode "Mataruško polje -Tukovi" i "Prijedorčanka " usvojeni na Skupštini . Pokrenute su aktivnosti za izradu nove Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode Grada Prijedora.

Sektorski cilj 2: Uspostavljen integralan sistem upravljanja otpadom

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja ekološkog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Uspostavljena baza podataka o proizvođačima otpada i zagađivačima okoline do 2015. godine;
- Sanirane sve divlje deponije do kraja 2016. godine;
- Uveden novi sistem prikupljanja, selekcije i reciklaže otpada do 2020. godine.

Očekivani ishod u 2017. godini: Sanirane divlje deponije u 2017. godini

Realizacija u 2017. godini: U skladu sa Pravilnikom o uspostavljanju evidencije izdatih ekoloških dozvola, uspostavljena je baza podataka o zagađivačima okoline za 2013, 2014. i 2015. godinu. U 2017. godini Komunalno preduzeće prikupilo je 226,12 t selektivnog otpada, te je izradilo i postavilo nove reciklažne mreže za papir , foliju i pet ambalažu.

U 2017. godini prikupljeno je i 201,62 t reciklažnog papira i 24,5 t plastične ambalaže.

Sektorski cilj 3: Smanjenje emisije CO2 kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja ekološkog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Smanjena emisija CO2 za 20% do kraja 2020. godine;
- Smanjena ukupna potrošnja energije za 5% do kraja 2020. godine;
- Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskej potrošnji iznosi najmanje 10% do kraja 2020. godine.

Očekivani ishod u 2017. godini: Smanjenje CO2 za 732,26 t i ušteda energije za 2.400,35 MWh

Realizacija u 2017. godini: U 2017. godini rekonstruisana je zgrada Gimnazije „Sveti Sava“ čime je došlo da smanjenja emisija CO2 za 66,8 t , a potrošnja energije je umanjena za 192,75 kwh.

Realizacija navedenog projekta će djelimično doprinijeti u realizaciji ovog sektorskog cilja.

Sektorski cilj 4: Izgrađen sistem upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacije stanovništva

Rezultati i napredak u ostvarenju *ovog cilja ekološkog razvoja* se prate preko sljedećih očekivanih ishoda (indikatora):

- Uspostavljen sistem redovnog praćenja kvaliteta životne sredine na području grada Prijedora do kraja 2018. godine;
- Preko 60% stanovništva obuhvaćeno promotivnim, informativnim i obrazovnim akcijama zaštite životne sredine do 2020. godine.

Očekivani ishod u 2017. godini: Izvještavanje o kvalitetu vazduha-dnevni ili mjesečni izvještaji

Realizacija u 2017. godini: U decembru 2015. godine puštena je u rad mjerna stanica za monitoring kvaliteta vazduha, a na web stranici **rhmzrs** dostupan je izvještaj o kvalitetu vazduha područje grada Prijedora.

Realizacija navedenog cilja je ostvarena kroz realizaciju 2 projekta u 2014. i 2015. godini („*Donošenje nedostajućih i noveliranje postojećih odluka u oblasti zaštite životne sredine*“, i „*Uspostavljanje informacionog sistema za upravljanje energijom*“). U saradnji sa GIZ-om (Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju), gradu Prijedoru je u 2014. godini doniran softver ENMASOFT za praćenje potrošnje energije u javnim ustanovama, čiji je osnivač Grad Prijedor.

Realizacijom navedenih projekata stvorene su pretpostavke za potpuno ostvarenje prvog ishoda ovog cilja (Uspostavljen sistem redovnog praćenja kvaliteta životne sredine na području grada Prijedora do kraja 2018. godine).

Kroz realizaciju naprijed navedenih ciljeva sektora zaštite životne sredine djelimično se ostvaruje strateški cilj 4 – „Uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti“.

3.4. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, Grad Prijedor je u izvještajnom periodu realizovao nekoliko projekata (*Podrška podizanju novih zasada voća, Podrška izgradnji štalskih objekata i nabavci opreme, Izgradnja fizičke infrastrukture za razvoj turizma, Uvođenje i promocija novih obrazovnih profila prema perspektivnoj potražnji na tržištu rada, Podsticaji za zapošljavanje novih radnika, Projekti podrške preduzetništvu, Izgradnja sportske dvorane u naselju Urije, Rekonstrukcija postojeće i vodovodne mreže, Rekonstrukcija postojećih NN mreža u gradskim i seoskim područjima, Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma u Prijedoru, Rekonstrukcija zgrade Gimnazije „Sveti Sava „ Prijedor, Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje, Rekonstrukcija domova kulture i još nekoliko projekata koji su manje budžetske vrijednosti, a koji su usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti. Ukupna vrijednost projekata koji su finansirani u 2017. godini iz eksternih izvora na bazi pomenute usklađenosti je 5.902.973,00 KM, gdje su dominirali Vlada RS sa 2.563.136,00 KM, Javna preduzeća 1.172.653,00 KM, Kredit 1.085.751,00 KM, Donatori 727.809,00 KM, Privatni izvori 175.700,00 KM, IPA 173.424,00 KM, Ostalo 4.500,00 KM.*

Može se reći da od viših nivoa vlasti dobijena sredstva nisu dovoljna za realizaciju navedenih projekata.

U pogledu horizontalne usklađenosti značajno je naglasiti da realizacija projektata iz društvenog sektora ima snažan uticaj na ekonomski sektor, a takođe ima uticaj i na sektor zaštite životne sredine (posebno projekti koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnja nove vodovodne i kanizacione mreže, na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže, unapređenje rada u oblasti zdrastva, te projekti koji se odnose na saobraćajnu infrastrukturu).

3.5. Institucionalni kapaciteti Gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima

Gradska uprava Grada Prijedora ima kompetentne i obrazovane ljudske resurse, koji su fleksibilni i spremni na promjene, odnosno poboljšanja, kroz kontinuiranu edukaciju, modernizaciju rada i stalno usavršavanje procesa i procedura.

Odlukom o osnivanju Gradske uprave Grada osnovan je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, s ciljem da Odsjek vodi poslove izrade i revizije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora 2014-2024, da vodi aktivnosti na izradi i provođenju Plana implementacije i usklađivanje finansijskog okvira plana implementacije sa gradskim budžetom, da vodi aktivnosti oko uključivanja strateških projekata i mjera pri izradi godišnjih planova rada odjeljenja, te obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, kome odgovara za svoj rad.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedora, u Odsjeku za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem definisana su četiri radna mjesta, na kojim je predviđeno 5 izvršilaca i to šef Odsjeka (1 izvršilac), Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje razvoja Grada (1 izvršilac), Samostalni stručni saradnik za upravljanje projektima i saradnju sa investitorima (2 izvršioaca) i Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove (1 izvršilac).

Tokom 2015. godine, uz pomoć UNDP/ILDP projekta, zaposleni u Gradskoj upravi i bitni akteri iz lokalne zajednice savladavali su procedure za planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje (PPVI) o implementaciji Strategije razvoja.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao dobro. Od ostalih aktera kao ključni partneri se izdvajaju UNDP/ILDP, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Turistička organizacija grada Prijedora, Privredni savjet, Partnerska grupa za razvoj, lokalna javna preduzeća koja realizuju projekte iz Strategije razvoja i drugi akteri. U pogledu daljeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je poboljšati saradnju sa privatnim sektorom, kroz jačanje uloge Privrednog savjeta.

4. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Na području grada Prijedora, živi 80.916 stanovnika, od čega je 14.018 zaposlenih lica, dok je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor, 5.950 nezaposlenih lica. Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika je 8.536 KM¹. Upoređujući grad u pogledu vitalnih makro indikatora sa prosjekom u RS može se zaključiti da je većina navedenih indikatora na nivou prosjeka u Republici Srpskoj. Neki pokazatelji su iznad, a neki ispod prosjeka u Republici Srpskoj. Na dan 31.12.2017. godine na području Prijedora bilo je 14.018 zaposlenih lica, što čini 17,32 % od ukupnog broja stanovnika Prijedora. U odnosu na prosjek RS (22,26 %) Prijedor ima nešto nižu stopu zaposlenosti. Kada je u pitanju nezaposlenost, na dan 31.12.2017. godine, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Prijedor, bilo je evidentirano 5.950 nezaposlenih lica, što čini 7,35 % od ukupnog broja stanovnika Prijedora. Navedena stopa je nešto niža od stope nezaposlenosti na nivou Republike Srpske (9,77 %). Prosječna neto plata na području grada Prijedora u 2017. godini 799 KM, dok je prosječna neto plata u Republici Srpskoj u 2017. godini iznosila 836 KM. U školskoj 2015/2016 godini osnovnu i srednju školu u Prijedoru je pohađalo 8.240 učenika (101 učenika na 1000 stanovnika). Navedeni broj učenika je nešto niži u odnosu na prosjek Republike Srpske (117 učenika na hiljadu stanovnika).

U nastavku je dat tabelaran prikaz makropokazatelja za polaznu i izvještajnu godinu (ili zadnju godinu za koju su podaci dostupni). Popunjene su kolone za koje se moglo doći do podataka:

¹ Podatak se odnosi na nivo Republike Srpske, Zavod za statistiku Republike Srpske

OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA	Indikator	Polazno stanje 2013			Izvršajna godina 2017			Uporedni podaci 2017		
		GRAD PRIJEDOR			GRAD PRIJEDOR			REPUBLIKA SRPSKA		
		Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski	Ukupno	Muški	Ženski
INDEKS RAZVIJENOSTI (FBIH) / STEPEN RAZVIJENOSTI (RS)	indeks									
Stanovništvo	broj	97.588			80.916	39.418	41.498	1.170.342	571.812	598.530
Zaposlenih stanovnika	broj	13.983	8.034	5.949	14.018	7.954	5.926	260.608		
	%	100	57,46	42,545	100	57,3 %	42,7 %	22,27 %		
Nezaposlenih stanovnika	broj	10.506	5.526	4.980	5.950	3.553	3.222	114.364		
	%	100	52,60	47,401	100	52,44 %	47,56 %	9,77 %		
Bruto domaći proizvod	iznos	8.761.456.000	Podaci na nivou RS- Izvor: Zavod za statistiku RS		9.991.036.000	Podaci na nivou RS-Izvor: Zavod za statistiku RS		9.991.036.000		
	po glavi	6.146			8.536			8.536		
Investicije na teritoriji JLS	iznos									
Broj preduzeća/1000 stanovnika	omjer	7,74			10,08					
Prosječna neto plata u KM	iznos	781	Podaci na nivou RS- Izvor: Zavod za statistiku RS		799			836		
Broj učenika osnovnih i srednjih škola na hiljadu stanovnika	broj	8875 (91/ 1000)	4379 495		8.240 (101/1000)			136.448, (117/1000)		
Socijalni transferi po glavi stanovnika	po glavi	1.951.380 (20KM/glavi)			3.371.470 (41,66 KM/glavi)					
Broj ljekara/1000 stanovnika	omjer	164 (1,68/1000)			163 (2,01/1000)					
Iznos realizovanih sredstava za prioritete iz razvojne strategije	iznos				9.199.546					
DOPUNSKI INDIKATORI RAZVOJA										
Udio realizovanih kapitalnih investicija u budžetu JLS	omjer	20%			36%					
Poljoprivrednih gazdinstava/1000 stanovnika	omjer	3014 (31/1000)			1127 (13,92/1000)					
Broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika	omjer	18.746 (192/1000)			17.662 (218/1000)					
Zdravstveno osiguranih lica u odnosu na ukupno stanovništvo	omjer	73.909 (76:100)			73.500					
Broj aktivnih članova u institucijama kulture	broj	53 zaposlena 1643 člana			53 zaposlena 1.680 članova					
Broj aktivnih članova u sportskim institucijama	broj	3120			3.050					
Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće	procenat	65%			76,40%					
Pokrivenost domaćinstava odvozom čvrstog otpada	procenat	57%			61%					
Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije	broj	1			1					
Broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji	broj	4			4					
Emisija CO2 po glavi stanovnika	tona	2,67 t/po glavi			3,20 t/po glavi					

5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Realizacija strategije u 2017. godini je dosta dobra, što pokazuje 54 % ostvarene realizacije u odnosu na plan. Kada se posmatra broj realizovanih projekata u odnosu na planiranu realizaciju, ostvarenje je 60 %, što govori da se za preostalih 40 % projekata nisu uspjeli obezbjediti uslovi za njihovu realizaciju. U pogledu „privlačenja“ eksternih izvora finansiranja procent od 64 % eksternih sredstava ukazuje na zadovoljavajuće stanje.

Imajući u vidu dosta složenu finansijsku situaciju u BiH i RS, Grad Prijedor je u 2017. godini veliku pažnju usmjerio na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove komunalne infrastrukture (rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže, izgradnja saobraćajne infrastrukture, rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetske infrastrukture), te na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove društvene infrastrukture (izgradnja dvorane u naselju Urije, rekonstrukcija domova kulture, izgradnja ambulanti porodične medicine, rekonstrukcija i izgradnja osnovnih škola i sl).

Kako u prethodnom periodu, tako se i u 2017. godini radilo na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenju domaćih i stranih investicija, zapošljavanju, ne zaboravljajući pri tom finansiranje redovnih aktivnosti svih budžetskih korisnika. Ostvareni su kontakti i obavljeni razgovori sa brojnim domaćim i inostranim privrednicima, a sve u cilju predstavljanja grada Prijedora kao pogodnog područja za investiranje, kako bi se u 2018. godini ušlo u konkretizovanje aktivnosti po pitanju njihovog dolaska i investiranja na području grada Prijedora.

Radilo se i na realizaciji projektata iz oblasti zaštite životne sredine, koji se odnose na izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka, izradu regulacionog plana područja uz korita rijeka Sana i Gomjenica, izradu novog programa sanitarne zaštite izvorišta pitke vode na području grada Prijedora i drugi projekti.

Takođe, Grad je tokom prethodnog perioda kandidovao veći broj projekata prema različitim domaćim i međunarodnim donatorima, kako bi obezbjedio sufinansiranje projekata iz Strategije.

Ako posmatramo ostvarenje sektorskih ciljeva, može se zaključiti da se ostvarenje većine sektorskih ciljeva odvija u skladu sa planiranom dinamikom, te da su na dobrom putu da njihovo ostvarenje u narednom periodu bude još veće.

U 2017. godini su značajno unaprijeđeni institucionalni kapaciteti za efikasno upravljanje razvojem. Saradnja između Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem i nadležnih odjeljenja i službi je veoma dobra, što u značajnoj mjeri poboljšava proces planiranja i upravljanja razvojem. Aktivnosti na izradi Plana implementacije za naredni trogodišnji period (2018-20. godina), a posebno za 2018. godinu su se odvijale paralelno sa izradom plana budžeta. To je dovelo do toga da su vlastiti izvori sredstava za realizaciju projekta iz Strategije za 2017. godinu u cjelosti usklađeni sa Planom budžeta za tu godinu.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- Plan implementacije za period 2017-2019. godinu je pripremljen u skladu sa kalendarom Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, te je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade budžeta grada i ostalih programskih dokumenata;
- Godišnji planovi rada službi/odjeljenja su pripremljeni u skladu sa kalendarom Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaji o realizaciji planova službi/odjeljenja su redovno razmatrani i korišteni za pripremu korektivnih mjera (te eventualnu izmjenu /dopunu Plana implementacije razvojne strategije);

- U pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom postignut je značajan napredak. U domenu jačanja javno-privatnog dijaloga nije ostvareno značajnije uključivanje privatnog sektora u implementaciju projekata ekonomskog razvoja.

U narednom planskom ciklusu potrebno je uraditi sljedeće:

- Treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- Neophodno je planirati početak realizacije projekata čija je realizacija planirana za 2017. godinu, pa je odgođena za 2018. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijedena sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

6. ANEKSI

- Plan implementacije Strategije integrisanog razvoja 2017-2019. godine.
- Godišnji planovi rada odjeljenja grada za 2017. godinu i prateći izvještaji o realizaciji.

OBRADIVAČ:

Odsjek za strateško planiranje,
upravljanje projektima i razvojem

PREDLAGAČ:

Gradonačelnik
Milenko Đaković
