

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA  
GRAD PRIJEDOR  
GRADONAČELNIK  
GRADSKA UPRAVA  
PRIJEDOR



---

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

---

PRIJEDLOG

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE  
INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA (2014. - 2024.)  
ZA 2021. GODINU**

**Prijedor, maj 2022. godine**

## IZVRŠNI SAŽETAK

Izveštaj o implementaciji Integralne Strategije razvoja Grada Prijedora (2014.-2024.) ima za cilj da pokrene sve bitne lokalne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i razvoja sektora zaštite životne sredine, u okviru četiri (4) definisana strateška cilja.

Planom implementacije za 2021. godinu planirana je realizacija **61** projekata, ukupne vrijednosti **9.029.515,00 KM**. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je **7.616.998,00 KM**, što iznosi **84 %** realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. Od ovog iznosa, 45 % sredstava je realizovano iz budžeta Grada, a 55 % sredstava je realizovano iz eksternih izvora.

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za 2021. godinu, grad Prijedor je realizovao ili je radio na realizaciji određenog broja projekata, kojima se rješavaju ključni problemi zajednice ili se ostvaruju preduslovi za realizaciju drugih ključnih vezanih projekata ( projekti unapređivanja poslovnog okruženja, koji imaju za cilj privlačenje domaćih i stranih investicija, projekti podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju, projekti podrške u poljoprivrednoj proizvodnji, zatim projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata društvene infrastrukture, projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata komunalne, saobraćajne i tehničke infrastrukture, te projekti unapređenja sistema zaštite životne sredine).

Tokom 2021. godine sektorski ciljevi su realizovani u skladu sa planiranom dinamikom, a najvažniji rezultati u realizaciji sektorskih ciljeva su:

- U ekonomskom sektoru, u 2021. godini, realizovano je ili se kontinuirano realizuje **27** projekat za čiju realizaciju je utrošeno **2.525.614,00 KM**. Realizacijom projekata iz ekonomskog sektora ostvareni su rezultati koji su planirani za 2021. godinu, a to se odnosi na projekte kojima se unapređivala konkurentnost MSP, projekti podrške preduzetništvu i zapošljavanju novih radnika, projekti unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

- U društvenom sektoru, u 2021. godini, nastavilo se sa rekonstrukcijom objekata iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite. Takođe se radilo na realizaciji projekata koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže i drugi projekti. U društvenom sektoru u 2021. godini realizovano je ili se kontinuirano realizuje **12** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **4.712.232,00 KM**.

- U sektoru zaštite životne sredine, u 2021. godini, realizovano je ili se kontinuirano realizuje **6** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **379.152,00 KM**. U ovoj oblasti realizovani su projekti koji se odnose na izgradnju kanalizacione mreže, rekonstrukciju distributivne mreže u AD „Toplana“, modernizaciju javne rasvjete, sanacije divljih deponija i drugi projekti.

Na osnovu prikazane realizacije projekata i ostvarenja sektorskih ciljeva, vidljiva je međusobna integrisanost i povezanost projekata i multisektorski doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva. U narednom periodu se nastavlja realizacija projekata koji se tiču vodosnabdjevanja, putne infrastrukture, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenja investitora, zapošljavanja, projekti podsticaja privrede i poljoprivrede i projekti promocije energetske efikasnosti, koji su međusobno povezani i u sinergiji. Kroz međusektorske uticaje, treba da daju značajan doprinos ostvarenju strateških ciljeva, a time i vizije grada Prijedora.

Iako je novi način planiranja implementacije, po MiPRO metodologiji, bio novina, svi učesnici procesa planiranja i implementacije su u prethodnom periodu uspjeli savladati proces i uvesti novi pristup u planiranju, praćenju i vrednovanju implementacije Strategije, što je samo po sebi značajan rezultat.

Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu realizacije Strategije u 2021. godini, preporuke za implementaciju Integralne strategije razvoja grada Prijedora u 2021. godini su:

- treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.

- neophodno je planirati početak realizacije projekata koji su trebali biti započeti u 2021. godini, a nisu i za koje se realno očekuje da će u narednom periodu biti obezbijeđena potrebna sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

## **1. UVOD**

Strategiju integralnog razvoja grada Prijedora za period 2014.-2024. godine izradio je Razvojni tim grada Prijedora u periodu od oktobra 2012. do decembra 2013. godine, u okviru Projekta integralnog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Strategija razvoja grada Prijedora usvojena je u decembru 2013. godine na 2. vanrednoj sjednici Skupštine grada Prijedor, održanoj dana 26.12.2013. godine. Kao operativni instrument za realizaciju Strategije, Grad priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije.

Ovaj izvještaj se odnosi na implementaciju strateških, odnosno, sektorskih, prioritarnih projekata u 2021. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije.

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedora je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave i eksternim partnerima, kao što su Javne ustanove i Javna preduzeća.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom čitave godine i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata-APIS). Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.

## **2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI**

### **2.1. Vizija**

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014. – 2024. godine, definisana je sljedeća vizija:

**„Prijedor 2024. – Grad pravih investicija i uspješnih ljudi“.**

### **2.2. Strateški ciljevi**

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014 – 2024. godine, definisana su 4 strateška cilja:

**Strateški cilj 1:** Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja;

**Strateški cilj 2:** Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura;

**Strateški cilj 3:** Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana;

**Strateški cilj 4:** Uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti.

### 2.3. Sektorski ciljevi

Strateški prioriteti za razvoj grada su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi:

#### **Ekonomski razvoj**

- Sektorski cilj 1:** Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone;
- Sektorski cilj 2:** Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima;
- Sektorski cilj 3:** Poboljšanje turističke ponude grada Prijedora, prvenstveno na području Nacionalnog parka „Kozara“;
- Sektorski cilj 4:** Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja;
- Sektorski cilj 5:** Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva.

#### **Društveni razvoj**

- Sektorski cilj 1:** Izgrađena društvena infrastruktura;
- Sektorski cilj 2:** Unaprijeđene društvene usluge građanima;
- Sektorski cilj 3:** Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura.

#### **Sektor zaštite životne sredine**

- Sektorski cilj 1:** Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta;
- Sektorski cilj 2:** Uspostavljen integralan sistema upravljanja otpadom;
- Sektorski cilj 3:** Smanjenje emisije CO<sub>2</sub> kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije;
- Sektorski cilj 4:** Izgradnja sistema upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacija stanovništva.

## **2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2021. godina)**

### **Ključni prioriteti ekonomskog sektora**

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2021. godinu su:

- stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za investiranje,
- podrška poljoprivrednoj proizvodnji,
- podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu,
- podrška zapošljavanju.

Fokusiranje na stalno unapređivanje poslovnog okruženja ima za cilj privlačenje investicija, što stvara preduslove za realizaciju sektorskog cilja 1 – „Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji“.

Podrškom malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju stvaraju se uslovi za realizaciju sektorskog cilja 4 – „Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja“.

### **Ključni prioriteti društvenog sektora**

U društvenom sektoru ključni prioriteti za 2021. godinu su:

- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata društvene infrastrukture,
- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture.

Fokusiranje na rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata društvene infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Izgrađena društvena infrastruktura “

Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 3 – „Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura“.

### **Ključni prioriteti sektora zaštite životne sredine**

Ključni prioriteti u sektoru zaštite životne sredine za 2021. godinu su:

- unapređenje sistema zaštite kvaliteta voda i izvorišta, te sistema zaštite od poplava,
- unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Fokusriranje na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne mreže i ostalih objekata vodosnabdijevanja treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta“.


Unapređenje sistema upravljanja otpadom treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Uspostavljen integralan sistem upravljanja otpadom“.

### 3. PREGLED IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA 2014.-2024.

#### 3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)

Strategijom razvoja grada Prijedora 2014.-2024. godine planirana je realizacija 167 projekata, od čega je 162 projekta planirano prilikom izrade Strategije, dok je 5 projekata naknadno uvršteno u Strategiju, a čije uključnje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva. U periodu 2014.-2020. godine započeta je realizacija 133 projekta, od kojih su 123 projekta višegodišnji, dok su 10 projekata jednogodišnji (čija je realizacija započeta i završena u jednoj godini). Od početka realizacije razvojne Strategije u potpunosti je završeno 33 projekat, što je 20 % od ukupno planiranih 167 projekata, a do 2021. godine započeto 133 projekta, što je 80 % od ukupno planiranih 167 projekata.

U nastavku je dat grafički prikaz implementacije broja projekata.

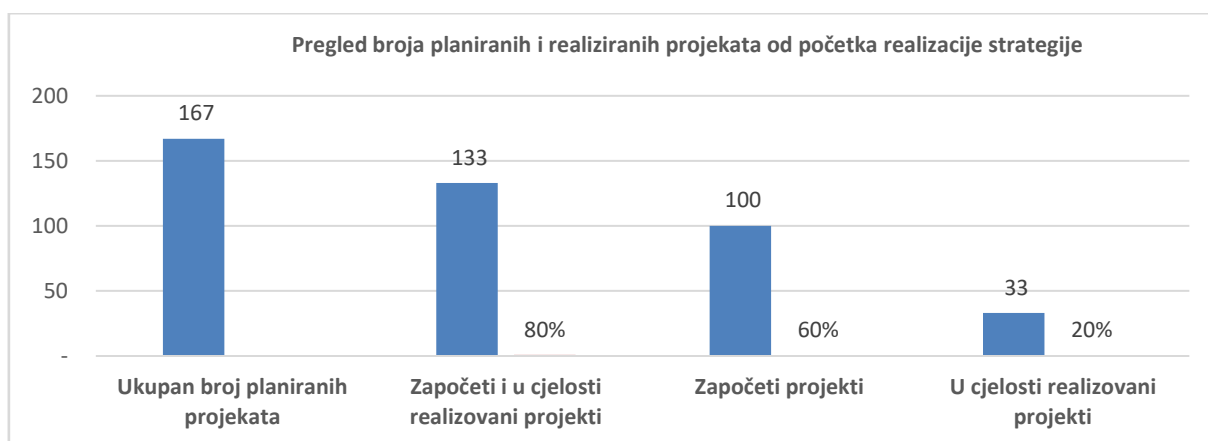


Ukupna vrijednost planiranih projekata, od početka realizacije Strategije, je **165.529.427,00 KM**, dok je vrijednost u potpunosti završenih projekata, kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije **111.387.735,00 KM**, što je **67 %** od planirane vrijednosti projekata. Od toga, vrijednost u potpunosti završenih projekata je **30.932.708,00 KM**, što je **20 %** u odnosu na ukupnu vrijednost planiranih projekata.

U strukturi ukupne vrijednosti projekata, čija je realizacija planirana za period 2014.-2021. godine, predviđeno je da se iz budžeta Grada finansira **32.792.176,00 KM (20 %)**, dok je **132.737.251,00 KM (80 %)** planirano iz eksternih izvora.

Kada je riječ o strukturi ukupne vrijednosti u potpunosti završenih projekata ili projekata koji su još uvijek u procesu realizacije u periodu 2014.-2020. godine, **34.466.129,00 KM (31 %)** je realizovano iz budžeta Grada, dok je **76.921.606,00 KM (69 %)** realizovano iz eksternih izvora. Pri tome, u strukturi vrijednosti u potpunosti realizovanih projekata, iz budžeta Grada realizovano je **8.381.774,00 KM (27 %)**, a **22.550.934,00 KM (73 %)** iz eksternih izvora.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske implementacije projekata.

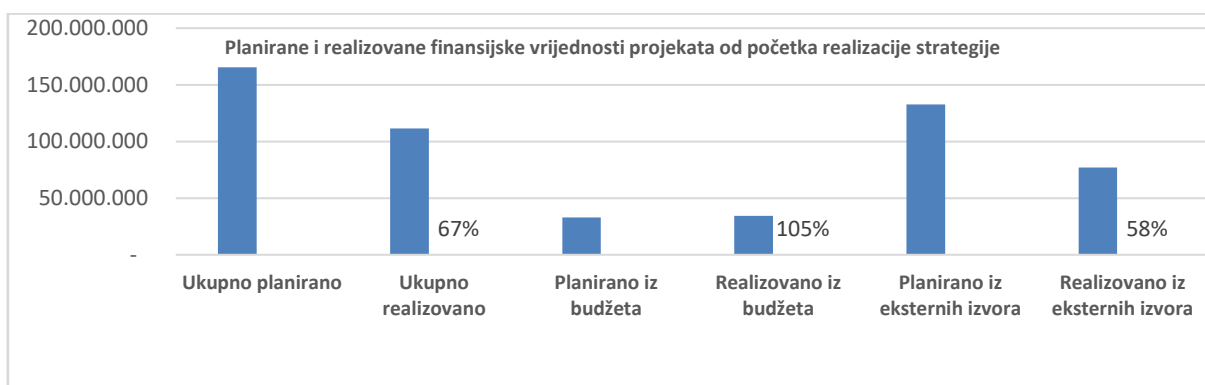

Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata od početka realizacije Strategije, može se zaključiti da je postignuta dobra realizacija. Ako se posmatra odnos planiranih i realizovanih projekata, koji su finansirani isključivo iz budžeta Grada, onda se može zaključiti da je realizacija izuzetno visoka u procentualnom iznosu od **105 %**, odnosno da je ista ostvarena za **5 %** više u odnosu na planiranu, dok iz eksternih izvora ova realizacija iznosi **58 %**.

### 3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2021. godini

Planom implementacije za 2021. godinu planirana je realizacija **61** projekta, čija je ukupna vrijednost iznosila **9.029.515,00 KM**. Od ukupnog broja planiranih projekata, **16** projekata nije realizovano tokom 2021. godine, uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti u ovih 16 projekata nisu realizovale.

U 2021. godini realizovano je ili se kontinuirano realizuje **45** projekta u ukupnoj vrijednosti od **7.616.998,00 KM**.




U nastavku je dat grafički prikaz realizacije projekata u 2021. godini:



Kada je riječ o finansijskoj realizaciji, može se zaključiti da vrijednost realizovanih projekata u 2021. godini iznosi **84 %** u odnosu na planiranu vrijednost. Pri tome, u ukupnoj vrijednosti realizovanih projekata, **45 %** se odnosi na finansiranje iz budžeta Grada, dok je **55 %** sredstava obezbijedeno iz eksternih izvora finansiranja.

Poredeći planiranu strukturu izvora finansiranja prema Planu implementacije za 2021. godinu, iz budžeta Grada je bilo predviđeno finansiranje projekata sa 52 %, a 48 % iz eksternih izvora finansiranja.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske realizacije po sektorima:

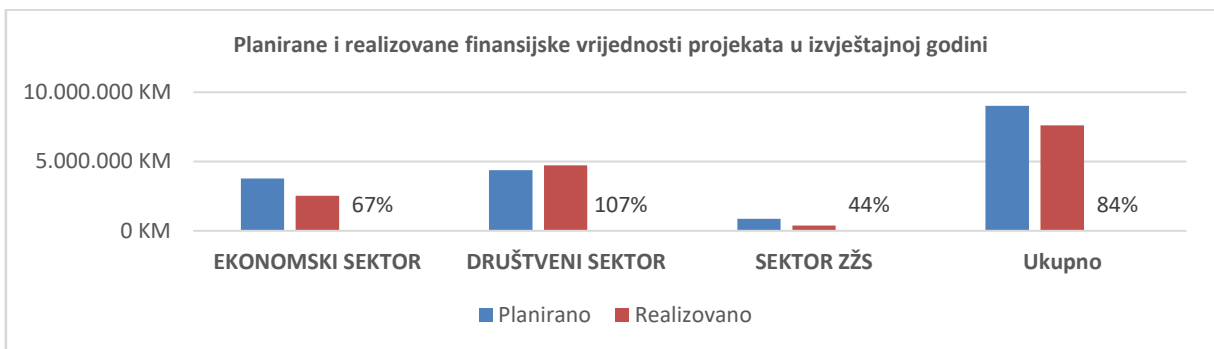

Na osnovu prikazanog, može se vidjeti da je u ekonomskom sektoru ostvaren solidan finansijski rezultat, da je u društvenom sektoru ostvaren izuzetno dobar finansijski rezultat i da je u sektoru zaštite životne sredine ostvaren osrednji finansijski rezultat.

U narednim tabelama dat je detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, te ukupno realizovano po sektorima i izvorima finansiranja u odnosu na planirano:

**Tabela 1.** Pregled planiranih i realizovanih projekata u 2021. godini (svi sektori)

<b>PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)</b>	<b>Broj projekata</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Iz budžeta</b>	<b>Iz eksternih izvora</b>
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	61	9.029.515,00	4.729.594,00	4.299.921,00
% struktura finansiranja od A			52 %	48 %
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	45	7.616.998,00	3.462.587,00	4.154.411,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	73 %	84 %		
% struktura (od B)			45 %	55 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	44	7.600.408,00	3.445.997,00	4.154.411,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	72 %	84 %		
% struktura (od C)			45 %	55 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	1	16.590,00	16.590,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	1 %	0,18 %		
% struktura (od D)			100 %	0,00 %

**Tabela 2.** Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.

	Sektor	Zbirna finansijska vrijednost projekata (KM)		Struktura finansiranja realizovanih projekata	
		Planirano	Realizovano	Budžet (%)	Ostalo (%)
2021. godina	Ekonomski razvoj	3.783.004,00	2.525.614,00	46 %	54 %
	Društveni razvoj	4.387.435,00	4.712.232,00	45 %	55 %
	Ekološki razvoj	859.076,00	379.152,00	47 %	53 %
	<b>Ukupno</b>	<b>9.029.515,00</b>	<b>7.616.998,00</b>	45 %	55 %
	% po planu implementacije	<b>100%</b>	<b>84 %</b>	<b>45 %</b>	<b>55 %</b>

Detaljna struktura izvora finansiranja za realizaciju navedenih projekata u 2021. godini data je u narednoj tabeli:

**Tabela 3.** Struktura izvora finansiranja

Izvor	Planirano	% ukupnog planiranog budžeta	Ostvareno	% ukupnog ostvarenog budžeta	Odnos ostvareno/planirano
1	2	3	4	5	6
Budžet JLS	4.729.594,00	52,38 %	3.462.587,00	45,46 %	73,21 %
Kredit	0,00	0,00 %	95.746,00	1,26 %	,-, %
Vlada RS	653.600,00	7,24 %	519.600,00	6,82 %	79,49 %
BiH	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
Javna preduzeća	1.276.000,00	14,13 %	911.587,00	11,97 %	71,44 %
Privatni izvori	271.163,00	3,00 %	63.080,00	0,83 %	23,26 %
IPA	398.980,00	4,42 %	102.843,00	1,35 %	25,77 %
Donatori	1.681.178,00	18,62 %	2.461.555,00	32,31 %	146,41 %
Ostalo	19.000,00	0,21 %	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>Ukupno:</b>	<b>9.029.515,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>7.616.998,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>84 %</b>

## I Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2021. godinu planirana je realizacija 39 projekata. Za realizaciju projekata u ovom sektoru planirana su sredstva u iznosu od **3.783.004,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **1.973.819,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **1.809.185,00 KM**.

U 2021. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 27 projekata, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **2.525.614,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **1.171.956,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbijeđen iznos od **1.353.658,00 KM**.

**Tabela 4.** Pregled planiranih i realizovanih projekata u ekonomskom sektoru u 2021. godini

<b>PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)</b>	<b>Broj projekata</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Iz budžeta</b>	<b>Iz eksternih izvora</b>
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	39	3.783.004,00	1.973.819,00	1.809.185,00
% struktura finansiranja od A			52 %	48 %
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	27	2.525.614,00	1.171.956,00	1.353.658,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	69 %	66 %		
% struktura (od B)			46 %	54 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	26	2.509.024,00	1.155.366,00	1.353.658,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	67 %	99 %		
% struktura (od C)			46 %	54 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	1	16.590,00	16.590,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	2 %	0,43 %		
% struktura (od D)			100 %	0,00 %

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti ekonomskog sektora u 2021. godini:

### **1. Izrada dokumenata prostornog uređenja za industrijske zone**

U 2021. godini završen je i usvojen Zoning plan radne zone. Usvajanjem ZP radne zone na potezu željeznička stanica, Toplana i TS Prijedor 1, završeni su svi planski dokumenti u funkciji Projekta osnivanja industrijskih zona.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 28.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 16.590,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavilo je Odjeljenje za prostorno uređenje.

### **2. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama**

U toku 2021. godine u okviru ovog projekta izvedeni su radovi na saobraćajnici C 106, koja se nalazi u industrijskoj zoni Celpak i to : radovi fekalne kanalizacije, radovi oborinske kanalizacije i svi potrebni pripremni radovi za asfaltiranje navedene saobraćajnice. Ostali su radovi prepumpne stanice, rasvjeta i asfaltiranje navedene saobraćajnice, koji će se izvesti u toku 2022 .godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 200.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 600.000,00 KM i to iz budžeta Grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 500.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

### **3. Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 85.000,00 KM i to iz budžet Grada 40.000,00 KM i eksternih izvora 45.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

#### **4. Podrška podizanju plastenika i staklenika**

Kroz ovaj projekat u 2021. godini izvršeno je sufinansiranje nabavke 20 plastenika, površine 100m<sup>2</sup>, sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama za jedan proizvodni ciklus (Sporazum između Grada Prijedora i MUSLIM AID-a Sarajevo). Finansiranje je bilo u omjeru Grad : donator : korisnik = 40% : 40% : 20%.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 65.000,00 KM i to iz budžet Grada 25.000,00 KM i eksternih izvora 40.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 57.520,00 KM, i to iz budžeta Grada 23.008,00 KM i eksternih izvora 34.512,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

#### **5. Podrška plantažnoj proizvodnji povrća i cvijeća**

Kroz ovaj projekat u toku 2021. godine 42 proizvođača su ostvarila podsticaj za postojeću proizvodnju povrća na otvorenom. Podsticaj je iznosio 100,00 KM/0,1 ha za neugovorenu, odnosno 100,00 KM /0,05 ha za ugovorenu proizvodnju povrća.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 20.000,00 KM i to iz budžet Grada 10.000,00 KM i eksternih izvora 10.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 22.960,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

#### **6. Podrška podizanju novih zasada voća**

U 2021. godini 6 proizvođača zasadili su ukupno 0,7 ha borovnice. Grad je sufinansirao 40% vrijednosti sadnog materijala.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 30.000,00 KM i to iz budžet Grada 10.000,00 KM i eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 5.498,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

## **7. Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju**

U okviru ovog projekta, u 2021. godini nastavljeni su radovi na izgradnji hladnjače za skladištenje voća u Omarskoj. U toku projekta koji je tekao predviđenom dinamikom izvođeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta – hale za potrebe distributivnog centra sa elektro i građevinskom fazom. U toku projekta održana su i predavanja za voćare, izrađena je veb stranica Distributivnog centra, izrađen je centralizovani informacioni sistem, izrađen je promotivni materijal, ugrađen je alarmni, protiv požarni sistem i video nadzor. Za potrebe hladnjače izvršena je i nabavka 380 boks paleta. Kao nastavak projekta sa IRB-om, ukazala se potreba za završetkom radova na hladnjači za skladištenje voća u Omarskoj. Ovim projektom je predviđena izgradnja ograde oko objekta, betoniranje platoa za prijem robe i instaliranje vage. U unutrašnjosti je potsavljen FERRO BETON i na galeriji su napravljene dvije kancelarije.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 110.000,00 KM i to iz budžet Grada 80.000,00 KM i eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 245.757,00 KM, i to iz budžeta Grada 150.011,00 KM i iz eksternih izvora 95.746,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

## **8. Podrška iskorištenju slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 120.000,00 KM i to iz budžet Grada 100.000,00 KM i eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

## **9. Podrška plantažnoj proizvodnji industrijskog bilja**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 35.000,00 KM i to iz budžet Grada 5.000,00 KM i eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

### **10. Podrška povećanju stočnog fonda**

U 2021. godini 64 proizvođača su ostavila podsticaj po muznom grlu od 100,00 KM i 21 proizvođač je ostvario podsticaj za koze i ovce koji je iznosio 10,00 KM/ grlo.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 350.000,00 KM i to iz budžet Grada 150.000,00 KM i eksternih izvora 200.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 125.994,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

### **11. Podrška izgradnji štalskih objekata i nabavka opreme**

U toku 2021. godine 61 proizvođač je ostvario podsticaj za nabavku nove mehanizacije i opreme. Podsticaj je iznosio 30% od vrijednosti novonabavljene mašine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 90.000,00 KM i to iz budžeta Grada 10.000,00 KM i eksternih izvora 80.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 62.824,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

### **12. Izgradnja fizičke infrastrukture za razvoj turizma**

Tokom 2021. godine na području grada Prijedora sprovodile su se određene aktivnosti na izgradnji fizičkih infrastruktura i kapaciteta za razvoj turizma, koji su uglavnom u privatnom vlasništvu i predstavljaju privatne investicije, pa je nepoznat podatak koji je to bio obim investicija u finansijskom smislu.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.



### **13. Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja**

Kroz ovaj projekat u toku 2021. godine, Turistička organizacija grada Prijedora je iz sredstava boravišne takse, izdvojila 2.995,00 KM za projekat „Revitalizacija biciklističke signalizacije- ruta A1 Crkve brvnare“. U okviru ove mjere KES „Albatros“ je kroz program „Via Dinarika“ kojeg finansira UNDP obezbjedio sredstva za projekat „Penjalište Zečiji kamen“ u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM. NP „Kozara“ je iz odobrenih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbjedio sredstva za projekat „Sanacija puta Duge njive-Gola planina-Mrakovica“ u iznosu od 19.600,00 KM. Biciklistički klub „Kozara“ je u 2021. godini započeo izgradnju prve XCO staze u BiH i Pump Track staze na području grada Prijedora, te je obezbjedio sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za infrastrukturne projekte i sadržaje u ovoj oblasti. Sredstva su obezbjeđena iz donatorskih sredstava.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 90.596,00 KM i to iz budžeta Grada 65.596,00 KM i iz eksternih izvora 25.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 55.595,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

### **14. Kreiranje i podsticaj razvoja novih turističkih proizvoda**

U toku 2021. godine u okviru ovog projekta realizovan je projekat FEEL Kozara čija je implementacija dovela do : 1. Poboljšanja i unapređenja turističke infrastrukture u oblasti avanturističkog turizma u NP Kozara (planinarenje, MTB-biciklizam, pješaćenje, edukativne staze, avantura park) i gastro ponude (promocija domaćih proizvoda i gastro ponuda); 2. Povećanje konkurentnosti lokalnog turizma kroz kreiranje novih turističkih proizvoda; 3. Promocija domaće turističke ponude i povećanje atraktivnosti turističke ponude prijedorskog područja. Turistička organizacija grada Prijedora je, zajedno sa NP „Kozara“, u 2021. godini kroz program „Via Dinarika“, kojeg finansira UNDP, obezbjedila sredstva za projekat „Unapređenje prodajnog mjesta na području NP Kozara“ u iznosu od 6.000,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 407.144,00 KM i to iz budžeta Grada 5.000,00 KM i iz eksternih izvora 402.144,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 173.668,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor i Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

## **15. Promocija turističke ponude Prijedora i Kozare**

U toku 2021. godine, Turistička organizacija je sprovodila niz promotivnih aktivnosti, u skladu sa krizom izazvanom pojavom pandemije virusa Korona i za iste namjene izdvojena su sredstva iz budžeta i boravišne takse Turističke organizacije u iznosu od 18.592,00 KM. Osim navedenih sredstava, Turističke organizacije grada Prijedora, u okviru ove mjere, pridružuju se sredstva Grada Prijedora koja su utrošena na organizaciju manifestacija „Prijedorska zima“ 2021. u iznosu od 35.000,00 KM. Takođe se dodaju i sredstva WWF Adria u iznosu od 10.000,00 KM, iz kojih su kreirani i distribuisani edukativni promotivni materijali za predškolce i osnovce, a isti je realizovao NP „Kozara“. U okviru ove mjere realizuju sve manifestacije koje Turistička organizacija grada Prijedora organizuje i uzme učešće u organizaciji, učešća na sajmovima u inostranstvu i zemlji, te grafički dizajn, štampanje i distribuisanje promotivnih materijala grada Prijedora, medijska promocija (tv i radijske emisije, najave i slično).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 60.000,00 KM i to iz budžeta Grada 42.000,00 KM i iz eksternih izvora 18.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 63.592,00 KM i to iz budžeta Grada 35.000,00 KM i iz eksternih izvora 28.592,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

## **16. Podrska inovacijama i investicijama u MSP**

U toku 2021. godine realizovan je Pravilnik o dodjeli podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP, kroz koji je podržano 11 privrednih subjekata iz oblasti prerađivačke industrije, a podrška se odnosila na davanje subvencije na nabavku mašina, opreme i/ili alata. Zatim, u okviru projekta koji realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA PRIJEDOR“, kao nastavak trogodišnjeg horizontalnog projekta TALIA, tzv. „horizontalni“ projekat, koji u okviru programske metodologije, nadzire i podržava realizaciju grupe projekata koja je usmjerena na oblast kreativne industrije i socijalnih inovacija. Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“ je dio konzorcijuma, koji umrežava predstavnike ova zajednice međusobno, kao i sa predstavnicima drugih tematskih zajednica definisanih programom Interreg MED.

Struktura projekta se sastoji od tri glavna dijela:

- Podrška izgradnji zajednice: Prateći rezultate projekata koji se bave kreativnošću i socijalnim inovacijama, fokus će biti na: a) vezi i interakciji s projektom PanoraMED Axis 4 i b) ostalim Interreg MED horizontalnim projektima i njihovom ciljanom publikom.

- Transfer znanja, koji posebno uključuje pripremu zajedničke baze podataka i organizaciju velikog niza posvećenih događaja na lokalnom i mediteranskom nivou, uključujući “Ljetnu školu za kreatore politika”, odnosno donosioce odluka.

- Kapitalizacija: uključuje stvaranje međuregionalnih radnih grupa širom prostora Mediterana.

Tokom 2021. godine, projektni tim je realizovao istraživanje primjera najbolje prakse u svim tematskim oblastima programa Interreg MED, te razvio platformu za prezentaciju digitalnih (online) alata za potrebe svih tematskih zajednica na području Mediterana.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 211.814,00 KM i to iz budžeta Grada 70.000,00 KM i iz eksternih izvora 141.814,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 168.308,00 KM, i to iz budžeta Grada 145.696,00 KM i iz eksternih izvora 22.612,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

### ***17. Podrška poslovnim udruženjima i klasterima***

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 10.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

### ***18. Podrška uvođenju standarda kvaliteta***

Kroz ovaj projekat u 2021. godini podržana je sertifikacija, odnosno, resertifikacija standarda kvaliteta kod dva privredna subjekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 9.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 4.256,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

## **19. Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća**

U decembru 2021. godine izvršeno je prebacivanje budžetskih sredstava na Razvojnu agencija grada Prijedor „PREDA“, koja je započela određene aktivnosti kao što je dizajn arhitekture web stranice koja će služiti za uvezivanje postojećih web stranica ([www.pd-drvo.com](http://www.pd-drvo.com); [www.metalprijedor.com](http://www.metalprijedor.com); [www.prijedorhub.com](http://www.prijedorhub.com) i [www.invesinprijedor.com](http://www.invesinprijedor.com)); zatim je izvršeno istraživanje tržišta za nabavku online analitičkog alata za SEO, promociju i marketing.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 20.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 24.900,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

## **20. Uvođenje i promocija novih obrazovnih profila prema perspektivnoj potražnji na tržištu rada**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 2.500,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

## **21. Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada**

U 2021. godini izvršeno je prebacivanje budžetskih sredstava na Agenciju PREDA PRIJEDOR, koja je realizovala određene aktivnosti i to: utvrđena dinamika realizacije planiranih programa osposobljavanja u okviru Prijedor HUB kapaciteta Agencije PREDA PRIJEDOR; programi obuke za dispečere u prevozu, web dizajn i 3D modeliranje koje će početi krajem marta 2022. godine; za formalne programe osposobljavanja (CNC operateri za drvoprerađu i metaloprerađu) uspostavljena je koordinacija sa Mašinskom školom i definisan je termin početka realizacije obuka za april 2022. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 30.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 30.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

## **22. Jačanje stručne prakse i praktične obuke**

U toku 2021. godine, u okviru projekta " INNO SCHOOL", realizovane su aktivnosti za jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja. U projektu se radi o kreiranju sistema učenja, odnosno, razvijanju softvera koji će biti atraktivan srednjoškolcima, unapređenju znanja relevantnih subjekata da koriste moderne sisteme učenja i usklađivanje nastavnih planova i programa da prate te promjene. Inovativni sistem obrazovanja podrazumijeva implementaciju novog didaktičkog sredstva - edukativnog programa u srednjim školama u okviru predmeta koji se odnose na preduzetništvo i ekonomiju. Edukativni program je savremeni "alat" pomoću kojeg učenici stiču nova znanja i vještine iz socijalnog preduzetništva, poslovnog planiranja, timskog rada i slično.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 40.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 10.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

## **23. Preduzetnička obuka za mlade**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 5.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

## **24. Izrada i realizacija akcionog plana za zapošljavanje**

U 2021. godini obezbjeđena su sredstva za kupovinu APIF podataka za izradu Akcionog plana za zapošljavanja grada Prijedora.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 3.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 3.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

## **25. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika**

Tokom 2021. godine podržano je zapošljavanje 106 radnika kod 60 poslodavaca (budžetska sredstva su obezbijeđena u okviru stavke 414100 - Sredstva za razvoj privrednih subjekata - broj pozicije 188).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 80.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 116.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

## **26. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova**

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2021. godini zaposlena su četiri VSS radnika, kod tri poslodavca iz kategorije mladih visokoobrazovanih.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 10.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 8.000,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

## **27. Podrška samozapošljavanju**

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2021. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 44 nezaposlena lica sa evidencije Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 60.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 136.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

### **28. Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 30.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

### **29. Podrška ženskom preduzetništvu**

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2021. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 7 žena.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 20.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 21.000,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

### **30. Jačanje Fondacije za razvoj**

Kroz ovaj projekat u 2021. godini realizovana sredstva se odnose na subvenciju kamata na odobrene kredite, koja su odobrena za 41 privredni subjekt.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 90.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 65.610,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

### **31. Unapređenje i primjena GIS-a**

U 2021. godini poboljšana je usluga i kompletirana je baza podataka za korisnike. Na godišnjem nivou količina podataka koja je unešena je veća za 10% od prošlogodišnje. Omogućeno je ažuriranje predmeta Odjeljenja za prostorno uređenje (integracija eDocument i GIS aplikacije) na svakodnevnom nivou. Svi predmeti Odjeljenja mogu se vidjeti na webGIS karti, a informacija o istima sa detaljnim atributima može se dobiti na kartici Informacije – Evidentirani zahtjevi.

Novi digitalni ortofoto za područje grada Prijedora povezan je sa GIS mapom. Izvršena je popuna GIS baze podataka sa podacima iz novih dokumenata prostornog uređenja, katastarskim parcelama i promjenama na katastarskim parcelama (posebno onim koje su vezane za predmete Odjeljenja). Na web GIS karti omogućen je prikaz

zemljišta koje je u katastarskom operatu upisano na Grad Prijedor i na Poljoproizvod d.p. sa ažurnosti 01.03.2021. godine, kao i prikazivanje toga atributa u Informacije – Katastarska čestica. Izvršen je prikaz nacionalnih spomenika BiH sa Liste nacionalnih spomenika BiH i sa Privremene liste nacionalnih spomenika BiH. Omogućen je pristup svim dokumentima prostornog uređenja i svim priložima tih dokumenata (za korisnike LAN mreže u izvornom obliku, a za korisnike WAN mreže u .pdf formatu)

Ažuriranje podataka o vodovodnoj i kanalizacionoj infrastrukturi vrši se odmah nakon dostavljenih promjena iz JKP „Vodovod“ a.d. Prijedor (na sedmičnom nivou).

Zatim, izvršena je nabavka novog GIS servera u provedenom postupku javne nabavke.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 37.908,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 31.543,00 KM, i to iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

### **32. Jačanje kapaciteta u oblasti projektnog menadžmenta**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 1.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

### **33. Infrastrukturna podrška preduzetništvu**

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta implementiran je projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije“ - CREATIVE@CBC. Projekat je podrška razvoju i saradnji kreativne i tradicionalne industrije u okviru kojeg se razvija infrastruktura i jačaju kapaciteti lokalnih ciljnih grupa i korisnika. Projekat je svojevrsan nastavak aktivnosti koje Grad Prijedor i Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“ preduzimaju na polju nabavke i primjene novih tehnologija u funkciji podrške razvoju preduzetništva i inovativnosti. Projekat će razviti okvir za podršku kreativnim industrijama, insistirajući na procesima umrežavanja u prekograničnom području. Prva dimenzija umrežavanja će se zasnivati na povezivanju tehničke i tehnološke infrastrukture - Kreativnih centara u Prijedoru, Sisku i Podgorici. Druga dimenzija će biti fokusirana na kompetencije i znanja koncentrisana u prekograničnoj mreži kreativne industrije.

Poboljšan je pristup znanju za vještine i kompetencije u kreativnim industrijama, pružajući pojedincima i organizacijama referentne tačke za informacije, savjetovanje i



mentorstvo u radu u kreativnim industrijama. Preko 30 osoba, uglavnom mladih iz Prijedora, imalo je priliku da pohađa treninge na sljedeće teme – digitalni marketing, izrada video igara (gaming industrija) i multimedija (audio/video produkcija). Bitno je napomenuti da sadržaji ovakve vrste trenutno nisu dostupni u Prijedoru i široj regiji ni na komercijalnim osnovama.

Zatim, poboljšana je pristup novim tehnologijama, kao ključnom aspektu novih poslovnih modela, sa setom uređaja, alata i opreme za kreativne industrije, dostupnih u kapacitetima Kreativnih centara u Prijedoru, Sisku i Podgorici. Isporuca opreme u Prijedoru je u toku, gdje će mladim preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima na raspolaganju biti studijski kapaciteti, video i audio oprema, IT oprema za audio/video produkciju i grafički dizajn, te CNC mašina za izradu prototipa od drveta i metala. Ugovoreni su radovi na adaptaciji tzv. aneksa Poslovnog centra Prijedor, u okviru kojeg će biti dostupni pomenuti sadržaji.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 410.000,00 KM i to iz budžeta Grada 310.000,00 KM i eksternih izvora 100.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 91.489,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

#### **34. Sajam privrede „Prijedor invest“**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 20.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

#### **35. Podrška razvoju prehrambene industrije**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 20.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

### **36. Podrška razvoju metaloprerađivačke i mašinske industrije**

U okviru ovog projekta tokom 2021. godine realizovan je projekat WHAMu okviru kojeg je završena obuka za 10 lica za zanimanje konstruktora alata i 10 lica za zanimanje CNC programera. Takođe uspješno je realizovan prvi dio obuke za web programera za 13 lica. Obuke za konstruktora alata i CNC programera se izvodi po neformalnom programu i predstavlja kombinaciju teorijske obuke (rad na softveru) i praktičane obuke, odnosno rada na mašinama u preduzeću "KOLEKTOR CCL – Poslovna jedinica Prijedor".

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 20.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 9.577,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

### **37. Podrška razvoju elektro industrije**

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 20.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

### **38. Podrška razvoju drvoprerađivačke industrije**

Tokom 2021. godine u okviru ovog projekta implementiran je projekta „REPRO – Obezbjedivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“. Cilj projekta je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unapređenje poslovne saradnje i umrežavanja. Projekat uvodi nove tehnologije i IKT alate u poslovanju ciljanih kompanija, a aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja Klaster „DRVO Prijedor“. Kroz projekat je uspostavljen „Centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru – Resursni centar“ koji ima za cilj da premosti postojeći jaz između aktivnosti i nastojanja da se stvore uslovi za rast i razvoj drvoprerade i proizvodnje nameštaja. Resursni centar podrazumjeva dvije funkcionalne cjeline:

- Administrativno-operativni dio koji se nalazi u prostorijama Razvojne agencije grada Prijedor „PREDA“ i
- Centar za brze intervencije u privredi, koji se nalazi u lokalnom preduzeću za prerađu drveta "Gavranović" d.o.o.

Projektom „REPRO“ se nastavlja podrška drvoprerađivačkom sektoru koji u svim bitnim pokazateljima pokazuje značajan doprinos rezultatima prijedorske privrede. Prisustvo i perspektive ove privredne grane počivaju na lokalnoj raspoloživosti sirovinske osnove, dobroj saobraćajnoj, energetske i drugoj infrastrukturi, dugoj tradiciji i kvalifikovanoj radnoj snazi, te povoljnom položaju u odnosu na tržišta sa značajnijom apsorpcijskom moći.

Formiran je Sektorski odbor u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja, čija je namjena sistemski obezbjediti direktniji pristup donosiocima vlasti i jačanje pregovaračke pozicije, kako bi se ublažile prepreke za inovacije, rast i razvoj. Sektorski odbor se sastaje i predlaže mjere za unapređenje uslova za razvoj drvoprerade i proizvodnje namještaja.

Kroz projekat je kreirana i Digitalna platforma ([www.pd-drvo.com](http://www.pd-drvo.com)) koja omogućuje 5 usluga za lokalne i regionalne drvoprerađivače:

1. Promociju i predstavljanje članova Klastera i privrednih subjekata (9 članica i 2 saradnika Klastera),
2. Bazu razvijenih modula obuke za zanimanja iz oblasti drvoprerade (11 edukativnih modula),
3. Bazu stručnjaka, saradnika i drugih organizacija za vezanih za podršku i unapređenje poslovanja 160 kontakt podataka institucija i organizacija za podršku poslovanju, pravnih lica (firmi), fizičkih lica (iz IT sektora), sudskih tumača i notara i advokata,
4. Bazu analiza, informacija i publikacija relevantnih za drvoprerađivački sektor (7 publikacija, analiza i informacija),
5. Bazu zakonske regulative, strategija (17 dokumenata), te aktuelna obavještenja kao što su npr. troškovi od interesa za proizvodnju i prodaju, uslovi transporta, zastoji na pojedinim graničnim prelazima, KOVID-19 uslovi za prelazak granice itd.

Kako je prethodno navedeno uspostavljen je i Centar za obuku za brzo osposobljavanje što je podrazumjevalo nabavku i instalaciju CNC mašina za bušenje u preduzeću Gavranović d.o.o. i za potrebu funkcionisanja centra razvijeni su specijalistički moduli obuka. Kroz Centar za obuku je obučeno 49 osoba (radnika/novozaposlenih/nezaposlenih/učenika) iz 11 preduzeća.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 394.376,00 KM, i to iz budžeta Grada 75.315,00 KM i iz eksternih izvora 319.061,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 251.636,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

### **39. Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti**

U 2021. godini održana je konferencija za dijasporu pod nazivom "Dijaspora i Prijedor" na kojoj je bilo oko 70 učesnika i izrađen je strateški dokument pod nazivom "Analiza i akcioni plan razvoja preduzetništva Grada Prijedora 2021-2027".

Zatim, tokom 2021. godine realizovan je projekat "Prijedor Circle HUB". Osnovni cilj projekta je bio doprinos zapošljavanju i boljim uslovima poslovanja kroz poboljšavanje startup ekosistema i investicionog okruženja.

Specifični cilj projekta bilo je testiranje inovativnog poslovnog modela u gradu Prijedoru kroz kapacitete „Prijedor Circle Huba“ u cilju obezbjeđivanja preduzetničkih prilika za mlade ljude, te razvoja vještina i znanja relevantnih za stanje na tržištu rada.

Aktivnosti koje su doprinijele ostvarivanju ovih ciljeva bile su:

- Edukacije nezaposlenih lica u IT oblastima relevantnim za tržište rada doprinese zapošljavanju i boljim poslovnim uslovima unaprijeđenjem startup ekosistema, održavanjem obuka s ciljem edukacije nezaposlenih lica u IT oblastima relevantnim za tržište rada.
- Umrežavanje STEM profesora, te sprovođenje STEM edukacija istim u cilju unaprijeđenja znanja i promocije STEM-a u prijedorskim školama.
- Razvoj prototipa na bazi IoT, sa namjenom u poljoprivredi, u okviru „Pathfinder“ servisa.
- Finansijska i mentorska podrška mladim startapima kroz „Accelerator“ servis.
- Kreirano je 14 emisija koje su imale namjenu da edukuju i informišu gledaoce u sferama kreativne industrije, IT tehnologije, preduzetništva i edukacije.

Beneficije od projekta je imalo preko 180 osoba, 5 startapa, uspostavljeni su održivi alati komunikacije između ciljnih grupa (STEM mreža profesora, „IT&Creative Pool“)

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 447.176,00 KM, i to iz budžeta Grada 190,000 KM i iz eksternih izvora 257.166,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 123.797,00 KM i to iz budžeta Grada 43.566,00 KM i iz eksternih izvora 80.231,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

Od ukupno 39 planiranih projekata u sektoru ekonomskog razvoja u 2021. godini, 12 projekata nije implementirano uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti u ovih 12 projekata nisu realizovale.

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača
2. Podrška plantažnoj proizvodnji industrijskog bilja,
3. Podrška iskorištenju slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju,
4. Izgradnja fizičke infrastrukture za razvoj turizma,
5. Podrška poslovnim udruženjima i klasterima,
6. Uvođenje i promocija novih obrazovnih profila prema perspektivnoj potražnji na tržištu rada,
7. Preduzetnička obuka za mlade,
8. Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija,
9. Jačanje kapaciteta u oblasti projektnog menadžmenta,
10. Sajam privrede „Prijedor invest
11. Podrška razvoju prehrambene industrije,
12. Podrška razvoju elektro industrije.

## II Sektor društvenog razvoja

U sektoru društvenog razvoja za 2021. godinu planirana je realizacija 14 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od **4.387.435,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **2.246.835,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **2.140.600,00 KM**.

U 2021. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 13 projekata, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **4.712.232,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **2.113.032,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbjeđen iznos od **2.599.200,00 KM**.

**Tabela 5.** Pregled planiranih i realizovanih projekata u društvenom sektoru u 2021. godini.

<b>PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)</b>	<b>Broj projekata</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Iz Budžeta</b>	<b>Iz eksternih izvora</b>
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	14	4.387.435,00	2.246.835,00	2.140.600,00
% struktura finansiranja od A			51 %	49 %
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	12	4.712.232,00	2.113.032,00	2.599.200,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	85 %	107 %		
% struktura (od B)			45 %	55 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	12	4.712.232,00	2.113.032,00	2.599.200,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	85 %	107 %		
% struktura (od C)			45 %	55 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	0	0,00	0,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	0 %	0 %		
% struktura (od D)			0 %	0 %

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti društvenog sektora u 2021. godini:

### **1. *Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata osnovnih škola***

U 2021. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 65.435,00 KM, i to iz budžeta Grada 46.835,00 KM i iz eksternih izvora 18.600,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

### **2. *Rekonstrukcija domova kulture.***

U okviru ovog projekta, u 2021. godini realizovana su sredstva iz budžeta Grada Prijedor u iznosu od 112.043,00 KM putem stavke 349 - Rekonstrukcija domova kulture i ostalih objekata u vlasništvu Grada Prijedor i to u Bišćanima, Lamovitoj, Baltama i Gornji Petrov Gaj.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 200.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 112.043,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

### **3. *Regulacioni plan sportskog aerodroma Urije***

Tokom 2020. godine izrađena je informaciono-dokumentaciona osnova Plana, a u 2021. godini završena je ažurna geodetska podloga i urađena je radna verzija prednacrtu Plana

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 10.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 18.338,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

#### **4. *Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje***

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta, izvedeni su radovi na završetku izgradnje dvije zgrade u Raškovcu. Jedna zgrada je sa 32 stana ( Regionalni stambeni program) i druga zgrada je sa 20 stanova ( CEB 2 projekat). Stanovi u zgradi sa 20 stanova su opremljeni sa komplet namještajem i bijelom tehnikom. Zgrade su i useljene, a korisnici su raseljena lica i izbjeglice. Vrijednost radova za obe zgrade u 2021. godini iznosi 1.000.000,00 KM ( donatorska sredstva) i 200.000,00 KM( sredstva Grada Prijedora).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 320.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 120.000,00 KM i iz eksternih izvora 200.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 1.200.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 200.00,00 KM i iz eksternih izvora 1.000.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

#### **5. *Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja u Prihvatnoj stanici***

Prihvatna stanica je namijenjena za prihvatanje i privremeni boravak žrtava porodičnog nasilja, te djece koja se nađu u prosjačenju, najduže do 72 sata, uz 24-časovnu kontrolu stručnih radnika Centra. Pripravnost stručnih radnika JU Centar za socijalni rad Prijedor je poseban oblik rada van radnog vremena, kod kojeg zaposleni mora biti stalno dostupan da bi izvršio neodložnu intervenciju. Prihvatna stanica raspolaže sa tri spavaće sobe, dnevnim boravkom, trpezarijom, dijelom opremljenim za dječiju igru, kupatilom i sanitarnim čvorom. Omogućava zbrinjavanje stanovništva koja se nađe u stanju socijalne potrebe.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 6.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 9.273,00 KM, i to iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.



## **6. Personalna asistencija - pomoć licima sa invaliditetom i zapošljavanje mladih**

Personalna asistencija je prošireno pravo iz Zakona o socijalnoj zaštiti, usvojeno odlukom Skupštine grada Prijedora u avgustu 2020. godine, koje ostvaruju lica starija od 18 godina, intelektualno očuvana, nepokretna i potpuno zavisna od pomoći i njege drugog lica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 66.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 5.178,00 KM, i to iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

## **7. Unapređenje kulturnih aktivnosti**

Tokom 2021. godine realizovano je nekoliko kulturnih manifestacija:

- Književni susreti na Kozari 40.000,00 KM,
- Likovna kolonija 14.000,00 KM,
- Festival pozorišta 64.000,00 KM,
- Akademija za Dan Republike Srpske 4.000,00 KM,
- Akademija za Dan Grada 7.000,00 KM,
- Finansiranje udruženja u oblasti amaterizma u kulturi 110.000,00 KM,
- Finansiranje Javnog gradskog hora 20.000,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 150.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 259.000,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za društvene djelatnosti.

## **8. Proširenje distributivne mreže u okviru postojećeg vodovodnog sistema**

U 2021. godini izvedeni radovi na Izgradnji, rekonstrukciji i mreži kućnih priključaka na vodovodnoj mreži u naselju Mulalići u MZ Hambarine. Projekat je finansiran sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica i Grada Prijedora u odnosu 50% : 50%.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 220.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 18.400,00 KM, i to iz budžeta Grada 9.200,00 KM i iz eksternog izvora 9.200,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

## **9. Izgradnja distributivne mreže u naseljima vododvodnog sistema "Crno Vrelo"**

U 2021. godini izvedeni su radovi na Izgradnji tercijarne mreže sa kućnim priključcima u 11 naselja. Potpisano je 2.500 Ugovora sa građanima o priključku na novoizgrađenu mrežu u toku 2021. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 2.300.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 1.500.000,00 KM i iz eksternih izvora 800.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 2.300.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 1.500.000,00 KM i iz eksternih izvora 800.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

## **10. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u užim gradskim područjima i izmještanje u putnu zonu**

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta, izvršene su rekonstrukcije na područjima: Prijedorčanka, Tukovi 2, Vodovod 2, Kozaraputevi, Anđe Knežević, kao i izmještanje mjernih mjesta u užim gradskim područjima.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 250.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 290.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

## **11. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u seoskim područjima i izmještanje u putnu zonu**

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta, izvršene su rekonstrukcije na području : Ljubija, Tomašica , Oštra Luka, Busnovi, Usorci, Omarska, Brežičani

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 420.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

## **12. Izgradnja NN mreža za potrebe novih naselja**

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2020. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

## **13. Rekonstrukcija 6,3 KV rasklopnica i trafostanica i prebacivanje na 20 KV napon – Ljubija i Tomašica**

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta, djelimično je rekonstruisana TS Donja Ljubija (potrebno još da se ugradi RMU - radovi su u toku); kompletno je urađena STS Busnovi - crkva i pripremljena je za prelazak na 20 kV napon. Obezbjeden je i materijal za STS Busnovi- škola i STS Busnovi dom, ali radovi nisu izvršeni u 2021. godini.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 50.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

## **14. Rekonstrukcija svih dalekovoda 6,3 KV i prebacivanje na 20 KV napon – Ljubija i Tomašica**

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija DV Busnovi 6 kV i velikim dijelom je pripremljen za prelazak na 20 kV (ostalo još da se ugradi 6 kablovskih glava, da se podigne 1 betonski stub i linijski rastavljač). Dalekovod Tomašica 6kV je snimljen i napravljen je eleborat za prelazak na 20 kV napon.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti, u okviru ovog projekta, u 2021. godini je bio 100.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 30.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

Od ukupno 14 planiranih projekata u sektoru društvenog razvoja u 2021. godini, dva projekta nisu implementirana zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na ovim projektima nisu realizovale. U pitanju su projekti „ Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata osnovnih škola“ i „Izgradnja NN mreža za potrebe novih naselja“.

### III Sektor zaštite životne sredine

U sektoru zaštite životne sredine, u 2021. godini, planirana je realizacija **8** projekata. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od **859.076,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **508.940,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **350.136,00 KM**.

U 2021. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija **6** projekata, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **379.152,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **177.599,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbjeđen iznos od **201.553,00 KM**.

**Tabela 6.** Pregled planiranih i realizovanih projekata u sektoru zaštite životne sredine u 2021. godini

<b>PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)</b>	<b>Broj projekata</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Iz Budžeta</b>	<b>Iz eksternih izvora</b>
<b>PLANIRANO</b>				
A. Ukupan broj planiranih projekata	8	859.076,00	508.940,00	350.136,00
% struktura finansiranja od A			59 %	41 %
<b>U REALIZACIJI</b>				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	6	379.152,00	177.599,00	201.553,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	75 %	44 %		
% struktura (od B)			47 %	53 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	6	379.152,00	177.599,00	201.553,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	75 %	44 %		
% struktura (od C)			47 %	53 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	1	5.835.619,00	5.835.619,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	9 %	167 %		
% struktura (od D)			100 %	0%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti sektora zaštite životne sredine u 2021. godini:

### ***1. Rekonstrukcija i dogradnja gradskog kanalizacionog sistema***

U 2021. godini izvedeni su radovi na izgradnji i priključku domaćinstava na kanalizacionu mrežu u pet ulica u naselju Janjića Pumpa. Projekat je sufinansiran sredstvima Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Grada Prijedora.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 70.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 101.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 31.000,00 KM i iz eksternih izvora 70.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

### ***2. Zoning plan područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora***

U 2020. godini održana je stručna rasprava na prednacrt Plana, utvrđen je Nacrt Plana od strane Skupštine Grada Prijedora, oglasen je i organizovan javni uvid na nacrt Plana, održana je javna rasprava i utvrđen Prijedlog Plana, koji je dostavljen nadležnom Ministarstvu na saglasnost. U 2021. godini provedene sve propisane aktivnosti i usvojen Zoning plan koji je u primjeni.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 75.297,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 116.599,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

### ***3. Realizacija etapnog plana Rudnika "Omarska" u oblasti izgradnje infrastrukture i zaštite životne sredine***

U 2021. godini u okviru ovog projekta urađeni su određeni infrastrukturni radovi, i to u različitim infrastrukturnim oblastima. U oblasti životne sredine i zelenih površina uspostavljen je monitoring svih elemenata životne sredine i izvršena je rekultivacija odlagališta jalovine Mamuze ( Tehnička i biološka).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 141.136,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 31.553,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavilo je preduzeće "Arcelor Mitall" d.o.o. Prijedor.

#### ***4. Rekonstrukcija distributivne mreže u AD „Toplana“***

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta, izvršena je rekonstrukcija distributivne mreže Toplana a.d. u Ulici Majora Milana Tepića u dužini od ukupno 150 metara.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 120.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 100.000,00 KM, iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Toplana a.d. Prijedor.

#### ***5. Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete u Prijedoru***

U 2021. godini nabavljen je materijal za proširenje mreže ulične rasvjete ( 12 stubova i 49 rasvjetnih tijela) u sljedećim ulicama i naseljima: Srednja Lamovita, P.P.Njegoša, Zanatska, Muharema Suljanovića, Krajiških brigada, Rakelići i obala Sane „Plaža“. Vrijednost nabavljenog materijala je cca 20.000,00KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 415.643,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 20.000,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

#### ***6. Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti***

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 24.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 12.000,00 KM i iz eksternih izvora 12.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

## **7. Obrazovanje i promocija energetske efikasnosti za građane**

U toku 2021. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 7.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 3.000,00 KM i iz eksternih izvora 4.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

## **8. Edukacija stanovništva radi podizanja ekološke svijesti**

U toku 2021. godine izvedene su ekološke manifestacije i to: ČISTO PROLJEĆE; UREDI SVOJ VRT i DANI BEZ AUTOMOBILA, za koje je utrošeno 8000,00 KM, a za 2000,00 KM posađene su nove sadnice drvoreda.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2021. godini je bio 6.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 3.000,00 KM i iz eksternih izvora 3.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je bio 10.000,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

Od ukupno 8 planiranih projekata u sektoru zaštite životne sredine u 2021. godini, dva projekta nisu implementirana zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na ovim projektima nisu realizovale.

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti i
2. Obrazovanje i promocija energetske efikasnosti za građane

### **3.3. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti**

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima, koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, Grad Prijedor je u izvještajnom periodu realizovao nekoliko projekata kao što su: *Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama, Podrška podizanju novih zasada voća, Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju, Podsticaji za zapošljavanje novih radnika, Projekti podrške preduzetništvu, Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže,, Rekonstrukcija postojećih NN mreža u gradskim i seoskim područjima, , Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje, Rekonstrukcija domova kulture* i još nekoliko projekata koji su manje budžetske vrijednosti, a koji su usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti.

Ukupna vrijednost projekata, koji su finansirani u 2021. godini, iz eksternih izvora na bazi pomenute usklađenosti je **4.154.411,00 KM** i to slijedećim redom:

1. Donatori: 2.461.555,00 KM;
2. Javna preduzeća: 911.587,00 KM;
3. Vlada Republike Srpske: 519.600,00 KM;
4. IPA: 102.843,00 KM;
5. Kredit: 95.746,00 KM
6. Privatni izvori : 63.080,00 KM
7. BiH 0,00 KM
8. Ostali izvori 0,00 KM.

Može se reći da od viših nivoa vlasti dobijena sredstva nisu dovoljna za realizaciju navednih projekata.

U pogledu horizontalne usklađenosti, značajno je naglasiti, da realizacija projektata iz društvenog sektora ima snažan uticaj na ekonomski sektor, a takođe ima uticaj i na sektor zaštite životne sredine (posebno projekti koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnja nove vodovodne i kanalizacione mreže, na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže, rekonstrukcija objekata osnovnih i srednjih škola, te projekti koji se odnose na saobraćajnu infrastrukturu).

### **3.4. Institucionalni kapaciteti Gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima**

Gradska uprava Prijedora ima kompetentne i obrazovane ljudske resurse, koji su fleksibilni i spremni na promjene i izazove, odnosno poboljšanja, kroz kontinuiranu edukaciju, modernizaciju rada i stalno usavršavanje procesa i procedura.

Odlukom o osnivanju Gradske uprave Grada Prijedor osnovan je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, s ciljem da Odsjek vodi poslove izrade i revizije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora 2014.-2024. i da vodi aktivnosti na izradi i provođenju Plana implementacije i usklađivanje finansijskog okvira Plana implementacije sa gradskim budžetom, aktivnosti oko uključivanja strateških



projekata i mjera pri izradi godišnjih planova rada Odjeljenja, te obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, kome odgovara za svoj rad.

Tokom 2015. godine, uz pomoć UNDP/ILDP projekta, zaposleni u Gradskoj upravi i bitni akteri iz lokalne zajednice, savladavali su procedure za planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje (PPVI) o implementaciji Strategije razvoja.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao dobro. Od ostalih aktera, kao ključni partneri, se izdvajaju UNDP/ILDP, Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“, Turistička organizacija grada Prijedora, Privredni savjet, Partnerska grupa za razvoj, gradska i republička Javna preduzeća i ustanove, koja realizuju projekte u okviru Strategije razvoja i drugi akteri. U pogledu daljeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je poboljšati saradnju sa privatnim sektorom, kroz jačanje uloge Privrednog savjeta.

#### **4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE**

Realizacija Strategije u 2021. godini je dobra, što pokazuje 84 % ostvarene finansijske realizacije u odnosu na Plan. Kada se posmatra broj realizovanih projekata u odnosu na broj planiranih projekata, ostvarenje je 73 %, odnosno realizovano je 45 projekata od 61 projekta.

U ukupnoj vrijednosti realizovanih projekata, 45 % se odnosi na finansiranje iz budžeta Grada, dok je 55 % sredstava obezbijeđeno iz eksternih izvora finansiranja.

Imajući u vidu dosta složenu finansijsku situaciju u BiH i Republici Srpskoj, Grad Prijedor je u 2021. godini veliku pažnju usmjerio na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove fizičke i komunalne infrastrukture (Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetske infrastrukture i sl. )

Kako u prethodnim godinama, tako se i u 2021. godini radilo na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenju domaćih i stranih investicija, zapošljavanju, ne zaboravljajući pri tom finansiranje redovnih aktivnosti svih budžetskih korisnika. Ostvareni su kontakti i obavljani razgovori sa brojnim domaćim i inostranim privrednicima, a sve u cilju predstavljanja grada Prijedora kao pogodnog područja za investiranje, kako bi se u 2022. godini realizovale aktivnosti po pitanju njihovog dolaska i investiranja na području grada Prijedora.

U 2021. godini saradnja između Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem i drugih nadležnih Odjeljenja i Službi je bila veoma dobra, što u značajnoj mjeri poboljšava proces planiranja i upravljanja razvojem.

Aktivnosti na izradi Plana implementacije za trogodišnji period (2021-2023. godina), a posebno za 2021. godinu, su se odvijale paralelno sa izradom plana budžeta za 2021. godinu. To je dovelo do toga da su vlastiti izvori sredstava za

realizaciju projekta iz Strategije za 2021. godinu u cjelosti usklađeni sa Planom budžeta za tu godinu.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- Plan implementacije za period 2021-2023. godinu je pripremljen u skladu sa kalendarom aktivnosti Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, te je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade Budžeta Grada i ostalih programskih dokumenata;

- Godišnji planovi rada Službi/Odjeljenja su pripremljeni u skladu sa kalendarom aktivnosti Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaji o realizaciji planova Službi/Odjeljenja su redovno razmatrani i korišteni za pripremu korektivnih mjera (te eventualnu izmjenu /dopunu Plana implementacije razvojne Strategije);

U narednom planskom ciklusu potrebno je uraditi slijedeće:

- Nastaviti sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.

- Neophodno je planirati početak realizacije projekata čija je realizacija planirana za 2021. godinu, pa je prolongirana za 2022. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijedena sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

## **5. ANEKSI**

- Plan implementacije Integralne Strategije razvoja grada Prijedora za period 2021-2023. godine.
- Godišnji planovi rada Odjeljenja za 2021. godinu i prateći izvještaji o realizaciji.

**OBRAĐIVAČ**  
Odsjek za strateško planiranje,  
upravljanje projektima i razvojem

**ŠEF ODSJEKA**  
Zinajda Hošić, dipl.ecc
